

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003-2011

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
SINALIZAÇÃO DA PISTA DO
AEROPORTO E CONSTRUÇÃO DO
TREVO DE ACESSO

CONTRATO N.º 064-2011

VENCEDORA: CONSTIL CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA.



SECRETARIA DA CIDADE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJETOS.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e quinze (27/07/2015), o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sorriso vem através deste, receber de forma Definitiva, a obra objeto da **CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 003/2011**, que trata da **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO E CONSTRUÇÃO DO TREVO DE ACESSO**, da cidade de Sorriso MT.

Por ser a expressão da verdade, certifico o presente, tendo em vista a Conclusão Definitiva da obra acima citada.

Sem mais para o momento

Luciano Clebert Seaburi

Engenheiro Civil

CREA – MT 170072976-4

Depto. de Engenharia – Prefeitura de Sorriso

DILCEU ROSSATO

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO


SECRETARIA DA CIDADE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJETOS.


RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze (25/05/2015), o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sorriso vem através deste, receber de forma Provisória, a obra objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2011**, que trata da **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO E CONSTRUÇÃO DO TREVO DE ACESSO**, da cidade de Sorriso MT.

Por ser a expressão da verdade, certifico o presente, tendo em vista a Conclusão Provisória da obra acima citada.

Sem mais para o momento


Luciano Clebert Scaburi
Engenheiro Civil
CREA - MT 170072976-4
Depto. de Engenharia - Prefeitura de Sorriso


DILCEU ROSSATO
Prefeito Municipal

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2014- VALOR E PRAZO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONTRATADO: R.D. COMÉRCIO DE IMPRESSORAS MUNICIPAIS LTDA

DATA 09/06/2015: NOVO PRAZO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2016

VALOR DO ADITIVO: TOTAL DE R\$ 119.646,35

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2014- SUPRESSÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONTRATADO: CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

DATA: 11/06/2015

SUPRESSÃO DO VALOR DE R\$ 104.642,96

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TRILHO DE FERROVIA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2014 - PRAZO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONTRATADO: RCA CONSTRUTORA LTDA - ME

DATA: 17/06/2015 - NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/07/2015 A 30/06/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NA RUA TROMBETAIS NO BAIRRO VILA BELA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONTRATADO: S.J. CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME

DATA: 18/06/2015 - NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA OBRA DE 19/06/2015 A 17/09/2015.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S SÃO DOMINGOS, NA RUA SAN-TOISIA, EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE SORRISO- MT SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2014 - PRAZO E SUPRESSÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONTRATADO: PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA ME

DATA: 17/06/2015 - NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/06/2015 A 01/12/2015

VALOR DO ADITIVO: R\$ 19.500,00. SUPRESSÃO DO VALOR DE R\$ 5.070,00. REFLEXO POSITIVO DO ADITIVO: R\$ 14.430,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES E/OU ALUNOS, GRUPOS CULTURAIS, FANFARRA MUNICIPAL E GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2014 - INCLUSÃO DE VALORES E EXAMES.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONTRATADO: BONONI & BONONI LTDA

REFLEXO POSITIVO DO ADITIVO: R\$ 48.825,00. PASSANDO ASSIM O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R\$ 97.650,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO - MT.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2014 - VALOR E INCLUSÃO DE EXAMES.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA EPP

DATA: 17/06/2015

REFLEXO POSITIVO DO ADITIVO: R\$ 92.855,45 PASSANDO ASSIM O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA: R\$ 345.082,25

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO - MT.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2014 - VALOR E INCLUSÃO DE EXAMES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONTRATADO: DIS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA

DATA: 17/06/2015

SUPRESSÃO DO VALOR DE R\$ 920.588,63. RESTANDO ASSIM O REFLEXO POSITIVO DO CONTRATO: R\$ 242.925,25

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO - MT.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2014 - VALOR E INCLUSÃO DE EXAMES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA

DATA: 17/06/2015

REFLEXO POSITIVO DO ADITIVO: R\$ 407.271,68 PASSANDO ASSIM O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA: R\$ 865.024,00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO - MT.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014 - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: GUIOMAR LUIS MOLOSSI - EPP

DATA: 24/06/2015 - NOVO PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DA OBRA 25/06/2015 A 24/07/2015.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR (PSF) POR-TO II COM ÁREA DE 486,87M², NA RUA PASSO FUNDO, LOTE 19, QDA. 08 DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1ª ETAPA, MUNICÍPIO DE SORRISO- MT. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

APOSTILAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2014

ENCERRADO
08/07/2015




SECRETARIA DA CIDADE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJETOS.


RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze (25/05/2015), o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sorriso vem através deste, receber de forma Provisória, a obra objeto da **CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 003/2011**, que trata da **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO E CONSTRUÇÃO DO TREVO DE ACESSO**, da cidade de Sorriso MT.

Por ser a expressão da verdade, certifico o presente, tendo em vista a Conclusão Provisória da obra acima citada.

Sem mais para o momento


Luciano Clebert Scaburi
Engenheiro Civil
CREA – MT 170072976-4
Depto. de Engenharia - Prefeitura de Sorriso



DILCEU ROSSATO
Prefeito Municipal



DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 064/2011 DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO, E A EMPRESA CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SORRISO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.239.076/0001-62, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, n.º 2525, centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. DILCEU ROSSATO, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado nesta cidade de Sorriso – MT, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 802.536.424-4 SSP/RS e CPF/MF sob o n.º 389.602.220-20, doravante denominado **CONTRATANTE**, e à empresa **CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.958.721/0001-86, e inscrição estadual n.º 13.055.293-3, estabelecida à Rua XV de Maio, n.º 510, Bairro Marechal Rondon, na cidade de Várzea Grande/MT., neste ato representada pelo seu sócio diretor o Sr. BRUNO SIMONI, portador da cédula de identidade RG sob n.º 107.687.731-3 SSP/RS e do CPF/MF sob n.º 808.761.450-04, denominado de **CONTRATADA**, tendo em vista os termos da **CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 003/2011**, e do contrato original n.º 064/2011, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

LANÇADO
11.06.2015

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo suprimir valores da planilha inicial da obra, conforme justificativa e requerimento em anexo, cláusula segunda, do contrato de n.º 064/2011, que terá a seguinte redação:



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Parágrafo Primeiro: Suprime-se do presente contrato o valor de R\$ 104.642,96 (cento e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), referente a materiais e serviços que não serão realizados, conforme **readequação da planilha inicial da obra.**

Parágrafo Segundo: O valor global do presente contrato passará a ser de R\$ 2.784.081,68 (dois milhões, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).”

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL:

O presente Termo Aditivo está amparado pelo artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no contrato inicial, celebrado entre as partes em data de 20/09/2011.

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Sorriso/MT., 11 de junho de 2015.

DILCEU ROSSATO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAP. LTDA
BRUNO SIMONI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: MARISETE M. BARBIERI
CPF: 651.470.061-68

NOME: CRISTIAN CEZAR GIRARDI
CPF: 875.062.891-72

SECRETARIA DA CIDADE
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS.

OF/ENG^a/OP. Nº. 160/2015

Sorriso/MT, 26 de maio de 2015.

A/C
MARILENE FELICITÁ SAVI
Secretária de Administração

27.05.2015
Pule
Secretaria de Administração


Referente: Solicitação de Aditivo Supressivo – Pavimentação, Sinalização e Trevo de Acesso ao Aeroporto Regional de Sorriso.

Ao tempo de cumprimentá-la, venho solicitar que seja feito o aditivo supressivo da obra de Pavimentação, Sinalização e Trevo de Acesso ao Aeroporto Regional de Sorriso, convênio 091-2007, objeto da CP 003/2011, contrato 064/2011, firmado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO e CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, dia 20/09/2011.

A obra foi finalizada e os serviços de instalação do grupo gerador não foram executados pois o projeto macro do aeroporto terá readequações.

Assim, com base no valor original da obra de **R\$ 2.888.724,64**, solicita-se agora **supressão** de materiais e serviços no valor de **R\$ 104.642,96** (Cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), equivalentes a – **3,622462%** do total inicial, totalizando a obra em **R\$ 2.784.081,68** (Dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.



Luciano Clebert Scaburi
Dep. de Convênios e Obras Públicas
CREA 170072976-4

Joãoilton de
Contratos

20.05.2015
P1
P. P. P.
27/05/15

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO			ADITIVO DE SUPRESSÃO				SINFRA			
Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso			Ordem de início de serviço: 20/09/2011		Nº Contrato: 064/2011		Prazo de Execução Inicial 120 dias			
Local: Aeroporto Municipal			Medição: 4ª Medição Provisória		Data Assinat: 20/09/2011		Prazo Aditivo 853 dias			
Bairro: Zona Rural			Período de medição: 01/05/2014 a 30/05/2014		Convênio:		Prazo Restante 0 dias			
Município: Sorriso - MT			Período acumulado: 01/10/2011 a 30/05/2014				Valor do Contrato 2.888.724,64			
			Empresa: Constil Construções e Terrap. Ltda				Valor med acumulado 2.784.081,68			
Código	Descrição	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada		
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado % Exec
1	TERRAPLENAGEM									
1.1	DESMAT, DESTOC E LIMPEZA ÁREAS COM ÁRVORES Ø ATÉ 0,15 M	M²	199.336,070	0,33	65.780,90		0,00	199.336,070	199.336,070	65.780,90 100,0%
	Subtotal de Terraplenagem				65.780,90		0,00			65.780,90 100,0%
2	PAVIMENTAÇÃO									
2.1	IMPRIMAÇÃO	M²	65.026,620	0,24	15.606,38		0,00	65.026,620	65.026,620	15.606,38 100,0%
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	46.674,260	0,16	7.467,88		0,00	46.674,260	46.674,260	7.467,88 100,0%
2.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M²	18.176,900	0,83	15.086,82		0,00	18.176,900	18.176,900	15.086,82 100,0%
2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - COM TRANSP. COMERC	TON	0,000	179,16	0,00		0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	TON	4.480,732	66,99	300.164,23		0,00	4.480,732	4.480,732	300.164,23 100,0%
2.5	TRANSPORTE COMERCIAL EM BASC. 10 M³ ROD. PAVIM - MAT. P/ CBUQ	T.KM	894.952,339	0,36	322.182,84		0,00	894.952,339	894.952,339	322.182,84 100,0%
2.6	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-20	TON	268,840	1.800,53	484.054,48		0,00	268,840	268,840	484.054,48 100,0%
2.7	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	79.520	2.718,06	216.140,13		0,00	79.520	79.520	216.140,13 100,0%
2.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	44,120	1.473,94	65.030,23		0,00	44,120	44,120	65.030,23 100,0%
2.9	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-20	TON	268,840	176,36	47.412,62		0,00	268,840	268,840	47.412,62 100,0%
2.10	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	79.520	176,36	14.024,14		0,00	79.520	79.520	14.024,14 100,0%
2.11	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	44,120	176,36	7.781,00		0,00	44,120	44,120	7.781,00 100,0%
2.12	TRANSP LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	44.809,687	0,55	24.645,32		0,00	44.809,687	44.809,687	24.645,32 100,0%
2.13	TRANSPORTE COMERCIAL EM BAS. 10 M³ ROD. PAVIM. MAT. P/ TSS	T.KM	62.341,262	0,38	23.689,67		0,00	62.341,262	62.341,262	23.689,67 100,0%
2.14	REESTABILIZAÇÃO GRANULOM DE SOLO COM ADIÇÃO DE MATERIAL	M³	11.704,790	7,03	82.284,67		0,00	11.704,790	11.704,790	82.284,67 100,0%
2.15	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	169.719,480	0,55	93.345,71		0,00	169.719,480	169.719,480	93.345,71 100,0%
	Subtotal serviços de Pavimentação				1.718.916,12		0,00			1.718.916,12 100,0%
3	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA									
3.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/ REVEST VEGETAL VPA 01	M	420,000	77,52	32.558,40		0,00	420,000	420,000	32.558,40 100,0%
3.2	ESCAV MECAN, REATERRO E COMPAC DE MATERIAL DE 1ª CAT	M³	22,000	9,34	205,48		0,00	22,000	22,000	205,48 100,0%
3.3	CORPO DE BUEIRO - BSTC DN 0,60 M	M	11,000	338,43	3.722,73		0,00	11,000	11,000	3.722,73 100,0%
3.4	BOCA DE BUEIRO - BSTC DN 0,60 M	UNID	2,000	765,47	1.530,94		0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
	Subtotal de Drenagem				38.017,55		0,00			38.017,55 96,0%
4	SINALIZAÇÃO									
4.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	5.619,350	20,13	113.117,51	0,000	0,00	5.619,350	5.619,350	113.117,51 100,0%
	Subtotal de sinalização				113.117,51		0,00			113.117,51 100,0%
5	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
5.1	HIDROSSEMIADURA	M²	80.000,000	1,40	112.000,00	0,000	0,00	80.000,000	80.000,000	112.000,00 100,0%
5.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS P/ ESCOAM/ ÁGUA CX EMPRÉST.	M³	18.200,000	5,00	91.000,00	0,000	0,00	18.200,000	18.200,000	91.000,00 100,0%
5.3	ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS C/S DE ESPRÉSTIMO	M³	11.993,652	6,26	75.080,26	0,000	0,00	11.993,652	11.993,652	75.080,26 100,0%
	Subtotal de Recuperação do Meio Ambiente				278.080,26		0,00			278.080,26 100,0%
6	SINALIZAÇÃO LUMINOSA									
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO COMPACTAÇÃO MATERIAL 1ª CAT	M³	500,000	43,93	21.965,00	250,000	10.982,50	250,000	500,000	21.965,00 100,0%
6.2	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=50MM	M	630,000	15,66	9.865,80	315,000	4.932,90	315,000	630,000	9.865,80 100,0%
6.3	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=75MM	M	3.910,000	18,02	70.458,20	1.955,000	35.229,10	1.955,000	3.910,000	70.458,20 100,0%
6.4	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=100MM	M	412,000	23,81	9.809,72	206,000	4.904,86	206,000	412,000	9.809,72 100,0%
6.5	RECOMPOSIÇÃO DO TERRENO	M³	350,000	25,66	8.981,00	175,000	4.490,50	175,000	350,000	8.981,00 100,0%
6.6	CAIXAS DE CONCRETO	UNID	16,000	331,68	5.306,88	8,000	2.653,44	8,000	16,000	5.306,88 100,0%
6.7	MACIÇOS DE CONCRETO	UNID	87,000	160,34	13.949,58	43,500	6.974,79	43,500	87,000	13.949,58 100,0%
6.8	CADA DE PASSAGEM TIPO 1	UNID	1,000	674,66	674,66	0,500	337,33	0,500	1,000	674,66 100,0%
6.9	CADA DE PASSAGEM TIPO 2	UNID	7,000	643,62	4.505,34	3,500	2.252,67	3,500	7,000	4.505,34 100,0%
6.10	CAIXAS DE INSPEÇÃO	UNID	91,000	565,62	51.471,42	45,500	25.735,71	45,500	91,000	51.471,42 100,0%
6.11	POÇOS DE ATERRAMENTO	UNID	17,000	550,66	9.361,22	8,500	4.680,61	8,500	17,000	9.361,22 100,0%
6.12	LANÇAMENTO DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO E LIGAÇÕES	M	5.440,000	2,20	11.968,00	2.720,000	5.984,00	2.720,000	5.440,000	11.968,00 100,0%
6.13	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO (16,0 M²)	M²	16,000	1.424,55	22.792,80	8,000	11.396,40	8,000	16,000	22.792,80 100,0%
	BALIZAMENTO									
6.14	LANÇAMENTO DOS CABOS DOS CIRCUITOS	M	4.500,000	12,19	54.855,00	2.250,000	27.427,50	2.250,000	4.500,000	54.855,00 100,0%
6.15	INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUZ	UNID	103,000	1.091,67	112.442,01	103,000	112.442,01	0,000	103,000	112.442,01 100,0%
6.16	LANÇAMENTO DOS CABOS DE CONTROLE	M	350,000	40,68	14.238,00	175,000	7.119,00	175,000	350,000	14.238,00 100,0%
6.17	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA									
6.18	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO 10 KW, 01 RCC 10 KW, CONTROLES DO FAROL E DA BIRUTA E ACESSÓRIOS	CJ	1,000	62.618,39	62.618,39	1,000	62.618,39	0,000	1,000	62.618,39 100,0%
6.19	GRUPO-GERADOR TRIFÁSICO, 220 V, 27 KVA	CJ	1,000	45.865,48	45.865,48	-1,000	-45.865,48	1,000	0,000	0,00 0,0%
6.20	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (30 KVA)	CJ	1,000	11.396,52	11.396,52	1,000	11.396,52	0,000	1,000	11.396,52 100,0%
6.21	INSTALAÇÃO DE POSTE E MONTAGEM DO FAROL DE AERÓDROMO	CJ	1,000	65.809,43	65.809,43	1,000	65.809,43	0,000	1,000	65.809,43 100,0%
	Subtotal de drenagem de águas pluviais				617.565,62		370.733,35			571.700,14 92,6%
7.1	TREVO DE ACESSO									
7.1.1	OBRAS COMPLEMENTARES									
7.1.2	ENLEVAMENTO	M²	1.368,140	6,40	8.756,09	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.2	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE									
7.2.1	ESCAV MECAN, REATERRO E COMPAC DE MATERIAL DE 1ª CAT	M³	120,170	9,34	1.122,38	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.2.2	MEIO FIO - MFC - 03	M	950,460	22,87	21.737,02	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.2.3	DESCIDA D' ÁGUA DAR-02	M	17,000	68,07	1.157,19	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.2.4	ENTRADA D' ÁGUA EDA-01	M	6,000	34,33	205,98	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.2.5	DISSIPADOR DE ENERGIA DED-01	UNID.	6,000	243,71	1.462,26	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.3	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA									
7.3.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	414,750	21,13	8.763,66	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.3.2	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHAS REFLET. BIDIRECTIONAIS	UNID.	380,000	17,37	6.600,60	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.3.3	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHÕES REFLET. BIDIRECTIONAIS	UNID.	83,000	43,76	3.632,08	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
7.3.4	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE PLACAS TOTALM.REFLETIVAS	M²	12,130	314,05	3.809,42	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00 0,0%
	Subtotal Trevo de Acesso				57.246,68		0,00			0,00 0,0%

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		ADITIVO DE SUPRESSÃO				SINFRA					
Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso		Ordem de início de serviço: 20/09/2011		Nº Contrato: 064/2011		Prazo de Execução Inicial		120 dias			
Local: Aeroporto Municipal		Medição: 4ª Medição Provisória		Data Assinat: 20/09/2011		Prazo Aditivo		853 dias			
Bairro: Zona Rural		Período de medição: 01/05/2014 a 30/05/2014		Convênio:		Prazo Restante		0 dias			
Município: Sorriso - MT		Período acumulado: 01/10/2011 a 30/05/2014				Valor do Contrato		2.888.724,64			
		Empresa: Constil Construções e Terrap. Ltda				Valor med acumul		2.784.081,68			
Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada			
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	% Exec
Total					2.888.724,64		370.733,35			2.784.081,68	96,4%
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em Local/Data: Sorriso/MT, 05 de Junho de 2014											
R\$370.733,35 (Trezentos e setenta mil setecentos e trinta e tres reais e trinta e cinco centavos)											



Obra: Pavimentação Asfáltica, Sinalização e Trevo de Acesso		Engenheiro Responsável Luciano Clebert Scaburi Crea 170072976-4	Prefeitura Municipal de Sorriso CONCLUSÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE SORRISO
Local:	Aeródromo de Sorriso-MT		
Munic.:	Sorriso - MT		
Contrato:	064/2011		
Data:	11/06/2015	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA INICIAL								12º ADITIVO								TOTAL	
			30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		1.320 dias		1.350 dias		1.380 dias		1.410 dias		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																			
1.0	Terraplenagem	65.780,90	0,00	0,00%	62.700,00	95,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.780,90	100,00%
2.0	Pavimentação	1.718.916,12	0,00	0,00%	188.219,88	10,95%	1.185.830,38	68,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.718.916,26	100,00%
3.0	Drenagem superficial e subterrânea	38.017,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.486,61	95,97%
4.0	Sinalização	113.117,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.117,51	100,00%
5.0	Recuperação do meio ambiente	278.080,26	0,00	0,00%	166.080,26	59,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	278.080,26	100,00%
6.0	Sinalização luminosa	617.565,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	571.700,14	92,57%
7.0	Trevo de Acesso ao Aeródromo	57.246,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PARCIAL	2.888.724,64	0,00	0,00%	417.000,14	14,44%	1.185.830,38	41,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.784.081,68	55,49%
	TOTAL ACUMULADO	2.888.724,64	0,00	0,00%	417.000,14	14,44%	1.602.830,52	55,49%	1.602.830,52	55,49%	2.784.081,68	96,38%	2.784.081,68	96,38%	2.784.081,68	96,38%	2.784.081,68	96,38%	2.784.081,68	96,38%

Local/Data: Sorriso/MT,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE SORRISO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 032/2014 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: RCA CONSTRUTORA LTDA - ME.

DATA: 23/03/2015 – NOVO PRAZO DE VIGENCIA DE 23/03/2015 À 07/05/2016

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 019/2014 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: SR. OLÍPIO CARLOS XAVIER DE MATOS.

DATA: 28/03/2015 – NOVO PRAZO DE VIGENCIA DE 28/03/2015 À 28/03/2016

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 064/2011 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

E EXECUÇÃO DA OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

DATA: 30/03/2015 – NOVO PRAZO DE VIGENCIA DE 30/03/2015 à 30/07/2015, EXECUÇÃO DA OBRA 30/03/2015 à 30/07/2015.

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TREVO ACES-

SO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

APOSTILAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA ME

DATA: 04/03/2015

APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS ATRAVÉS DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 148/2014, QUE TERÁ A SEGUINTE REDAÇÃO: O VALOR DA GASOLINA DO TIPO COMUM, POR LITRO PASARÁ A SER R\$ 3,76 (TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2014, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA DO TIPO COMUM PARA ATENDER A FROTA DA SUBPREFEITURA DE BOA ESPERANÇA.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

DATA: 04/03/2015

APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS ATRAVÉS DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 162/2014, QUE TERÁ A SEGUINTE REDAÇÃO:

O VALOR DO ÓLEO DIESEL (S-500) POR LITRO PASARÁ A SER R\$ 2,89 (DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) E GASOLINA COMUM POR LITRO PASARÁ A SER R\$ 3,04 (TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2014, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 025/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: PAZ AMBIENTAL LTDA EPP

DATA: 10/03/2015

APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A INCLUSÃO NA CLAUSULA SEXTA DO QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVOS E VALORES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO CONTRATO N.º 025/2015, QUE TERÁ A SEGUINTE REDAÇÃO CONFORME QUADRO ABAIXO:

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE ESTIMADA MENSAL	QTDE ESTIMADA ANUAL	SERV. COLETA, ARMAZEN., TRATAMENTO E DESTINO FINAL UNIT.	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	169872	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE LIXO TIPO A, B E E, ESTIMADO EM 18.000 (DEZOITO MIL) QUILOS DE LI-	KG	1.500	18.000	R\$ 2,90	R\$ 4.350,00	R\$ 52.200,00

LANÇADO
09.04.15



DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 064/2011 DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO, E A EMPRESA CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SORRISO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.239.076/0001-62, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, n.º 2525, centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. DILCEU ROSSATO, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado nesta cidade de Sorriso – MT, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 802.536.424-4 SSP/RS e CPF/MF sob o n.º 389.602.220-20, doravante denominado **CONTRATANTE**, e à empresa **CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.958.721/0001-86, e inscrição estadual n.º 13.055.293-3, estabelecida à Rua XV de Maio, n.º 510, Bairro Marechal Rondon, na cidade de Várzea Grande/MT., neste ato representada pelo seu sócio diretor o Sr. BRUNO SIMONI, portador da cédula de identidade RG sob n.º 107.687.731-3 SSP/RS e do CPF/MF sob n.º 808.761.450-04, denominado de **CONTRATADA**, tendo em vista os termos da **CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 003/2011**, e do contrato original n.º 064/2011, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo aditar prazo para conclusão da obra, conforme justificativa e requerimento em anexo, cláusula oitava, do contrato de n.º 064/2011, que terá a seguinte redação:



CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO:

Atribui-se ao presente termo aditivo o novo prazo de vigência do contrato e execução da obra, ficando a vigência do contrato de 10 de junho de 2015 à 08 de outubro de 2015 e o prazo de execução de 30 de março de 2015 à 28 de julho de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL:

O presente Termo Aditivo está amparado pelo artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no contrato inicial, celebrado entre as partes em data de 20/09/2011.

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Sorriso/MT., 26 de março de 2015.

DILCEU ROSSATO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAP. LTDA
BRUNO SIMONI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: MARISETE M. BARBIERI
CPF: 651.470.061-68

NOME: CRISTIAN CEZAR GIRARDI
CPF: 875.062.891-72



OF/ENG^a/OP. N° 058/2015

Sorriso/MT, 16 de março de 2015.

A/C
MARILENE FELICITÁ SAVI
Secretária de Administração

Recebido em: 16/03/2015
Assinatura: Perla
Secretaria de Administração

Referente: Solicitação de Aditivo de prazo de Execução e Vigência do Contrato Nº 064/2011
Execução de Pavimentação, Sinalização da Pista do Aeroporto.

O Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sorriso vem através deste, solicitar aditivo de prazo Execução e Vigência de 120 (cento e vinte) dias para o contrato 064/2011 da empresa **CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, para Pavimentação Asfáltica, Sinalização e Construção de Trevo de Acesso, conforme Memoriais, Projetos e Planilha Orçamentária que constam no Edital de Concorrência Pública nº 003/2011.

Está sendo solicitado junto ao Governo do Estado ampliação de meta física para reutilização dos rendimentos do convênio, e assim executar o aumento dos seguintes serviços, construção de stop way nos 2 finais da pista, aumento da largura do acesso do taxi way para a pista, de 18m para 25m e iluminação dos mesmos, para tanto os projetos estão em análise na Secid em Cuiabá, aguardando aprovação e posterior liberação.

Sem mais para o momento.

Luciano Clebert Scaburi
Eng. Civil – Departamento. Engenharia
Prefeitura Municipal de Sorriso

PREFEITURA MUNICIPAL
SORRISO - MT
PROTOCOLADO
Em 17/03/2015
Nº Dcto. 12.14 Jm
Horas. 01

[Handwritten signature]

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



PARECER JURÍDICO

LICITAÇÃO: Concorrência Pública n.º 003/2011

CONTRATO: N.º 064/2011

EMENTA: Contrato de execução de obras de pavimentação asfáltica, sinalização da pista do aeroporto municipal e construção do trevo de acesso, sob o regime de empreitada global.

O presente contrato foi celebrado entre o Município de Sorriso e a empresa **CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, tendo por objeto a execução de obras de pavimentação asfáltica, sinalização da pista do aeroporto municipal e construção do trevo de acesso, sob o regime de empreitada global, conforme Edital e Anexos da Concorrência Pública nº 003/2011.

Nos termos da cláusula 8ª do contrato, as obras deveriam ser concluídas no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviços.

É o breve relato, passamos a análise da possibilidade e viabilidade legal do pedido, nos termos do ofício 058/2015.

O presente pedido foi enviado tendo em vista que o contrato tem prazo de vigência e execução que encerra-se em 30 de março de 2015, declinando que o motivo decorre que está sendo solicitado junto ao governo estadual ampliação de meta física para reutilização dos rendimentos do convênio, e assim executar os serviços de **construção de stop way nos 2 finais de pista, aumento da largura do acesso de taxi way para a pista, de 18m para 25m e iluminação dos mesmos.**

A questão a ser enfrentada diz respeito à possibilidade jurídica da prorrogar o contrato pelo prazo de mais 120 (cento e vinte) dias.



A lume do indigitado artigo 57 em seu parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, elenca diversas situações ensejadoras da prorrogação, mas que, também, se sujeitam à disciplina temporal estatuída no *caput*, a saber:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela administração;

II - superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei;

V - impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

(...)"

Na mesma senda, constata-se que a previsão de dilatação de prazo prevista na cláusula oitava e seus parágrafos.

Vale apenas trazer à baila, ainda, o raciocínio do doutrinador Hely Lopes Meirelles que assim declina:

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



"A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra nos ajustes por tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se extinguem pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração do prazo de sua vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo para a entrega da obra ou do serviço ou da compra sem sanções contratuais; nos segundos, o prazo é de eficácia do negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo de execução e prazo extintivo do contrato." (Hely Lopes Meirelles, Licitação e contrato administrativo, 12. ed., Malheiros, 1999, p. 213).


Assim, considerando tratar-se o caso em tela de contrato cuja extinção ocorre com o cumprimento de seu objeto entendemos ser possível a **prorrogação do prazo de vigência e execução pelo período de mais 120 dias, nos termos do artigo 57, § 1º, I c/c art. 65, da Lei Federal n. 8.666/93.**

E Por fim, é imprescindível que seja promovido o aditamento contratual, este é o parecer que não vincula a decisão a ser tomada pelo Gestor do Município.

É o nosso entendimento.

Submeto à consideração superior as manifestações supra.

Sorriso, 23 de março de 2015



ROBERTO CARLOS DAMBROS
Assessor Jurídico
OAB/MT N.º 13154

Obra: Pavimentação Asfáltica, Sinalização e Trevo de Acesso Local: Aeródromo de Sorriso-MT Munic.: Sorriso - MT Contrato: 064/2011 Data: 30/03/2015			Prefeitura Municipal de Sorriso CONCLUSÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE SORRISO Reajustamento - Abr07 a Julh10									
			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA INICIAL								11º ADITIVO								TOTAL	
			30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		1.320 dias		1.350 dias		1.380 dias		1.410 dias		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																			
1.0	Terraplenagem	65.780,90	0,00	0,00%	62.700,00	95,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.780,90	100,00%
2.0	Pavimentação	1.718.916,12	0,00	0,00%	188.219,88	10,95%	1.185.830,38	68,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.718.916,26	100,00%
3.0	Drenagem superficial e subterrânea	38.017,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.530,94	0,25%	38.017,55	100,00%
4.0	Sinalização	113.117,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.117,51	100,00%
5.0	Recuperação do meio ambiente	278.080,26	0,00	0,00%	166.080,26	59,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	278.080,26	100,00%
6.0	Sinalização luminosa	617.565,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.465,48	7,36%	617.165,62	99,94%
7.0	Trevo de Acesso ao Aeródromo	57.246,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.246,68	9,27%	57.246,68	100,00%
	TOTAL PARCIAL	2.888.724,64	0,00	0,00%	417.000,14	14,44%	1.185.830,38	41,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	104.243,10	3,61%	2.888.324,78	55,49%
	TOTAL ACUMULADO	2.888.724,64	0,00	0,00%	417.000,14	14,44%	1.602.830,52	55,49%	1.602.830,52	55,49%	2.784.081,68	96,38%	2.784.081,68	96,38%	2.784.081,68	96,38%	2.888.324,78	99,99%	2.888.324,78	99,99%

Local/Data: Sorriso/MT,

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO: N.º 064/2011 – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA
OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: CONSTIL CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA
DATA: 30/11/2013 – NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
DE 30/11/2014 À 30/03/2015
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E
CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE
EMPRESITADA POR PREÇO GLOBAL.

Publicado por:
Maristete Marchioro Barbieri
Código Identificador:AE3F4F7F

Materia publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO no dia
10/12/2014, Edição 2120
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o
código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/>

LANÇADO
10/12/14



CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO:

Atribui-se ao presente termo aditivo o novo prazo de vigência e execução da obra, estabelecido há findar em 30/03/2015, ficando o mesmo vigente de **30/11/2014 à 30/03/2015**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL:

O presente Termo Aditivo está amparado pelo artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no contrato inicial, celebrado entre as partes em data de 20/09/2011.

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Sorriso/MT., 28 de novembro de 2014.

DILCEU ROSSATO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAP. LTDA
BRUNO SIMONI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: MARISETE M. BARBIERI
CPF: 651.470.061-68

NOME: CRISTIAN CEZAR GIRARDI
CPF: 875.062.891-72

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONTRATO - DÉCIMO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO: N.º 064/2011 - PRAZO DE VIGÊNCIA E
EXECUÇÃO DA OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: CONSTIL CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA
DATA: 30/11/2013 - NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
DE 31/05/2014 À 30/11/2014
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E
CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Publicado por:
Marisete Marchiori Barbieri
Código Identificador: C3464F9C

Matéria publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO no dia
08/12/2014. Edição 2118
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o
código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/>

LANÇADO
10/02/14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONTRATO - NONO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO: N.º 064/2011 - PRAZO DE VIGENCIA E
EXECUÇÃO DA OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: CONSTIL CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA
DATA: 30/11/2013 - NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
DE 31/05/2014 À 30/11/2014
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E
CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Publicado por:
Marisete Marchioro Barbieri
Código Identificador:3DE9B19F

Matéria publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO no dia
13/06/2014. Edição 1993
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o
código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/>

LANCADO
16/06/14

12º 28' 18.23"
90 05.54



DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 064/2011 DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO, E A EMPRESA CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SORRISO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.239.076/0001-62, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, n.º 2525, centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. DILCEU ROSSATO, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado nesta cidade de Sorriso – MT., portador da cédula de identidade RG sob o n.º 802.536.424-4 SSP/RS e CPF/MF sob o n.º 389.602.220-20, doravante denominado **CONTRATANTE**, e à empresa **CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.958.721/0001-86, e inscrição estadual n.º 13.055.293-3, estabelecida à Rua XV de Maio, n.º 510, Bairro Marechal Rondon, na cidade de Várzea Grande/MT., neste ato representada pelo seu sócio diretor o Sr. BRUNO SIMONI, portador da cédula de identidade RG sob n.º 107.687.731-3 SSP/RS e do CPF/MF sob n.º 808.761.450-04, denominado de **CONTRATADA**, tendo em vista os termos da CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 003/2011, e do contrato original n.º 064/2011, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo aditar prazo para conclusão da obra, conforme justificativa e requerimento em anexo, cláusula oitava, do contrato de n.º 064/2011, que terá a seguinte redação:

LANÇADO
10/12/14



NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 064/2011 DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO, E A EMPRESA CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SORRISO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.239.076/0001-62, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, n.º 2525, centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. DILCEU ROSSATO, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado nesta cidade de Sorriso – MT., portador da cédula de identidade RG sob o n.º 802.536.424-4 SSP/RS e CPF/MF sob o n.º 389.602.220-20, doravante denominado **CONTRATANTE**, e à empresa **CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.958.721/0001-86, e inscrição estadual n.º 13.055.293-3, estabelecida à Rua XV de Maio, n.º 510, Bairro Marechal Rondon, na cidade de Várzea Grande/MT., neste ato representada pelo seu sócio diretor o Sr. BRUNO SIMONI, portador da cédula de identidade RG sob n.º 107.687.731-3 SSP/RS e do CPF/MF sob n.º 808.761.450-04, denominado de **CONTRATADA**, tendo em vista os termos da CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 003/2011, e do contrato original n.º 064/2011, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo aditar prazo para conclusão da obra, conforme justificativa e requerimento em anexo, cláusula oitava, do contrato de n.º 064/2011, que terá a seguinte redação:

LANÇADO
01/07/14



CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO:

Atribui-se ao presente termo aditivo o novo prazo de vigência e execução da obra, estabelecido há findar em 30/11/2014, ficando o mesmo vigente de 31/05/2014 à 30/11/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL:


O presente Termo Aditivo está amparado pelo artigo 65 da Lei 8.666/93.


CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no contrato inicial, celebrado entre as partes em data de 20/09/2011.

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Sorriso/MT., 28 de maio de 2014.


DILCEU ROSSATO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAP. LTDA
BRUNO SIMONI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


NOME: CRISTIAN CEZAR GIRARDI
CPF: 875.062.891-72


NOME: MILENE TOMASI NARDI
CPF: 024.845.741-18



NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 064/2011 DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO, E A EMPRESA CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

O **MUNICÍPIO DE SORRISO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.239.076/0001-62, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, n.º 2525, centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. DILCEU ROSSATO, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado nesta cidade de Sorriso – MT., portador da cédula de identidade RG sob o n.º 802.536.424-4 SSP/RS e CPF/MF sob o n.º 389.602.220-20, doravante denominado **CONTRATANTE**, e à empresa **CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.958.721/0001-86, e inscrição estadual n.º 13.055.293-3, estabelecida à Rua XV de Maio, n.º 510, Bairro Marechal Rondon, na cidade de Várzea Grande/MT., neste ato representada pelo seu sócio diretor o Sr. BRUNO SIMONI, portador da cédula de identidade RG sob n.º 107.687.731-3 SSP/RS e do CPF/MF sob n.º 808.761.450-04, denominado de **CONTRATADA**, tendo em vista os termos da CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 003/2011, e do contrato original n.º 064/2011, ajustam e acordam celebrar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo aditar prazo para conclusão da obra, conforme justificativa e requerimento em anexo, cláusula oitava, do contrato de n.º 064/2011, que terá a seguinte redação:

LANÇADO
16/06/14



CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO:

Atribui-se ao presente termo aditivo o novo prazo de vigência e execução da obra, estabelecido há findar em 30/11/2014, ficando o mesmo vigente de **31/05/2014 à 30/11/2014**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL:

O presente Termo Aditivo está amparado pelo artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no contrato inicial, celebrado entre as partes em data de 20/09/2011.

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Sorriso/MT., 28 de maio de 2014.

DILCEU ROSSATO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAP. LTDA
BRUNO SIMONI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: CRISTIAN CEZAR GIRARDI
CPF: 875.062.891-72

NOME: MILENE TOMASI NARDI
CPF: 024.845.741-18

30
31
31
30
61
183

Obra: Pavimentação Asfáltica, Sinalização e Trevo de Acesso
Local: Aeródromo de Sorriso-MT
Munic.: Sorriso - MT
Contrato: 064/2011
Data: 27/01/2014

Prefeitura Municipal de Sorriso
CONCLUSÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE SORRISO
Reajustamento - Abr07 a Julh10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			CRONOGRAMA INICIAL								8º ADITIVO									
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		900 dias		930 dias		960 dias		990 dias		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																			
1.0	Terraplenagem	65.780,90	0,00	0,00%	62.700,00	95,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.780,90	100,00%
2.0	Pavimentação	1.718.916,12	0,00	0,00%	188.219,88	10,95%	1.185.830,38	68,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.718.916,26	100,00%
3.0	Drenagem superficial e subterrânea	38.017,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.530,94	4,03%	36.486,61	95,97%
4.0	Sinalização	113.117,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.117,51	100,00%
5.0	Recuperação do meio ambiente	278.080,26	0,00	0,00%	166.080,26	59,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	278.080,26	100,00%
6.0	Sinalização luminosa	617.565,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	416.598,83	67,46%	200.966,79	32,54%
7.0	Trevo de Acesso ao Aeródromo	57.246,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.246,68	100,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PARCIAL	2.888.724,64	0,00	0,00%	417.000,14	14,44%	1.185.830,38	41,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475.376,45	16,46%	1.602.830,52	55,49%
	TOTAL ACUMULADO	2.888.724,64	0,00	0,00%	417.000,14	14,44%	1.602.830,52	55,49%	1.602.830,52	55,49%	2.413.348,33	83,54%	2.413.348,33	83,54%	2.413.348,33	83,54%	2.888.724,78	100,00%	2.413.348,33	83,54%

Local/Data: Sorriso/MT,

Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4

LANÇADO

Revisi 10.03.14

1746000

CHRY 1001310-4
ENGINEER CIVIL
LUCIANO C. SCARPA
CHRY 1001310-4

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: N.º 064/2011 – PRAZO DE
VIGENCIA E EXECUÇÃO DA OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.
CONTRATADO: CONSTIL CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA
DATA: 30/01/2013 – NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
DE 31/01/2014 À 31/05/2014
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL E
CONSTRUÇÃO DO TREVO ACESSO, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Publicado por:
Marisete Marchioro Barbieri
Código Identificador: A897B5E5

Matéria publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO no dia
13/02/2014. Edição 1911

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o
código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/>

LANÇADO



Prefeitura Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"


Gestão 2009 / 2012


PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO **SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO** **DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJETOS**

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, portadora do CNPJ: n.º 096.434.006/0001-46, sito á Rua Pernambuco, n.º 3300 – São José do Rio Preto/SP, na pessoa do seu responsável técnico, o Sr. **Silas da Silva Júnior**, cadastrado no CREA/RNP sob o n.º 1701638517, compareceu no local onde serão executadas as obras de pavimentação Asfática, sinalização e Construção do Trevo de Acesso do Aeroporto Municipal de Sorriso/MT. Tendo tomado conhecimento das condições do local onde serão executadas as obras a serem licitadas. O presente atestado é emitido conforme previsto no edital da Concorrência Pública **003/2011**.

Sorriso/MT, 08 de agosto de 2011.


Cristiane Pellizzaro Burin
Engenheira Civil
Prefeitura Municipal de Sorriso
CREA/RNP 17070553-60


Recebido em
08/08/2011



Prefeitura Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Gestão 2009 / 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO


SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJETOS

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP**, portadora do CNPJ: n.º 03.791.330/0001-30, sito á Estrada Rural – km 1,3 – Caixa Postal 36 – Sorriso/MT, na pessoa do seu responsável técnico, o Sr. **Ademar Marques Curvo Sobrinho**, cadastrado no CREA/RNP sob o n.º 1206193654, compareceu no local onde serão executadas as obras de pavimentação Asfáltica, sinalização e Construção do Trevo de Acesso do Aeroporto Municipal de Sorriso/MT. Tendo tomado conhecimento das condições do local onde serão executadas as obras a serem licitadas. O presente atestado é emitido conforme previsto no edital da Concorrência Pública **003/2011**.

Sorriso/MT, 03 de agosto de 2011.


Flávio Leal de Oliveira
Fiscal de Obras
Prefeitura Municipal de Sorriso
Técnico em Edificações
CREA/RNP 1201354730

RECEBI EM 03/08/11




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000

www.crea-mt.org.br - crea-mt@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº: 46699

Validade: 31/03/2012

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966, sob o número 18935 desde 14/07/2009 com CNPJ

03.791.330/0001-30, a seguinte pessoa jurídica:

T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP

Registrada para: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, REFORMAS E DEMOLIÇÕES DE OBRAS CIVIS E DE ARTE;
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E URBANIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE CÁLCULOS
ESTRUTURAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E
SANEAMENTO BÁSICO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, RUAS E
AVENIDAS, IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, EXECUÇÃO DE REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E COLOCAÇÃO
DE MEOI-FIOS E SARJETAS, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO POR ENCOMENDA DE ARTEFATOS DE
CIMENTO E ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO E COMÉRCIO DE MISTURA
ASFÁLTICA E MATERIAL BETUMINOSO.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: EST RURAL, KM 1,3 - CAIXA POSTAL 36
INDEFINIDO
SORRISO-MT
78890-000

Capital Social: R\$ 500.000,00 Registrado na Junta Comercial em 20/03/2009

Responsabilidade Técnica: **THAIS SALTON**

Carteira MT018248-D expedida em 25/03/2009, responsável técnico desde 14/07/2009

Registrado sob o número 18248, em 25/03/2009 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1207276685

Validade do contrato do profissional: / /

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Responsabilidade Técnica: **ADEMAR MARQUES CURVO SOBRINHO**

Carteira MT05601/D-D expedida em 30/07/1991, responsável técnico desde 14/07/2009

Registrado sob o número 5601, em 30/07/1991 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1206193654

Validade do contrato do profissional: / /

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva de seus Responsáveis Técnicos e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 28 de Julho de 2011



Prefeitura Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

Gestão 2009 / 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJETOS

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LDA**, portadora do CNPJ: n.º 15.958.721/0001-86, sito á Rua 15 de Maio n.º 510 – Marechal Rondon – Várzea Grande/MT, na pessoa do seu responsável técnico, o Sr. **Ludmilson Martins de Assis**, cadastrado no CREA/RNP sob o n.º 1204552029, compareceu no local onde serão executadas as obras de pavimentação Asfáltica, sinalização e Construção do Trevo de Acesso do Aeroporto Municipal de Sorriso/MT. Tendo tomado conhecimento das condições do local onde serão executadas as obras a serem licitadas. O presente atestado é emitido conforme previsto no edital da Concorrência Pública **003/2011**.

Sorriso/MT, 03 de agosto de 2011.


Flávio Leal de Oliveira
Fiscal de Obras
Prefeitura Municipal de Sorriso
Técnico em Edificações
CREA/RNP 1201354730

Recebi em 03/08/2011
Ludmilson M. Assis



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000
www.crea-mt.org.br - crea-mt@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº: 52271
Validade: 31/03/2012

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966, sob o número 2368 desde 10/11/1988 com CNPJ 15.958.721/0001-86, a seguinte pessoa jurídica:

CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Registrada para: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E OBRAS DE ARTE, SANEAMENTO BÁSICO E INFRA-ESTRUTURA GERAL, CONSTRUÇÃO CIVIL COM OU SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E INDUSTRIAL, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS E PRIVADOS.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: R 15 DE MAIO, 510
MARECHAL RONDON
VARZEA GRANDE-MT
78140-410

Capital Social: R\$ 12.000.000,00 Registrado na Junta Comercial em 25/03/2010

Responsabilidade Técnica: **SERGIO RASTOLDO RIBEIRO**

Carteira SP00066065-D expedida em 09/04/1979, responsável técnico desde 25/02/1999
Vistado sob o número 3058, em 19/04/1983 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 2606410904

Validade do contrato do profissional: / /

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ART. 28 EXCETO ALINEA C (ESTRADAS DE FERRO) E ALINEA G E ART. 29 EXCETO ALINEA A DO DEC. FED. 23.569 DE 11/12/1933.

Responsabilidade Técnica: **MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES**

Carteira MT10353/D-D expedida em 15/04/2003, responsável técnico desde 10/11/2006
Registrado sob o número 10353, em 15/04/2003 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1203367880

Validade do contrato do profissional: / /

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Responsabilidade Técnica: **MARCELO GLERIAN**

Carteira MT11432/D-D expedida em 12/06/2004, responsável técnico desde 06/12/2010
Registrado sob o número 11432, em 12/06/2004 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1205514961

Validade do contrato do profissional: / /

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Responsabilidade Técnica: **LUDMILSON MARTINS DE ASSIS**

Carteira MT06040/D-D expedida em 02/04/1993, responsável técnico desde 14/06/2011
Registrado sob o número 6040, em 02/04/1993 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1204552029

Validade do contrato do profissional: / /



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000

www.crea-mt.org.br - crea-mt@crea-mt.org.br

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva de seus Responsáveis Técnicos e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 1 de Agosto de 2011

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em www.crea-mt.org.br - serviços - certidões com o número 52271. Fone para contato: 0xx-65-33153099. email: atendimento@crea-mt.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO

OFÍCIO DCOP N.º 044/2014

Sorriso, 11 de Junho de 2014.

A

ILMA.

Sr. Marilene Felicita Savi
Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal

NESTA.


Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através desta, solicitar que seja feito o pagamento referente à Execução de Obra no Aeroporto Municipal: Pavimentação Asfáltica, Sinalização e Construção de Trevo de Acesso no valor de **R\$ 370.733,35** (trezentos e setenta mil setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), para a empresa **Constil Construções e Terraplanagem LTDA**, com Contrato nº 064/2011 (Concorrência Pública nº 003/2011).

O pagamento acima solicitado refere-se 4ª medição que foi realizada pelo departamento de engenharia na Obra de Pavimentação Asfáltica, Sinalização e Construção de Trevo de Acesso. Segue anexa planilha de medição e relatório fotográfico, atestado pelo departamento de engenharia.

Sendo que se apresentava para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


Marcelo Rodrigues Ferraz

Diretor do Departamento de Convênios e Obras Públicas

LANÇADO
16/06/2014 3º
47: 443
447
526
924
925
326
815
805
443
447
454
19050-
19051-

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**RESUMO DE MEDIÇÃO****SINFRA**

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso			Ordem de início de serviço: 20/09/2011			Nº Contrato: 064/2011			Prazo de Execução Inicial			120 dias	
Local: Aeroporto Municipal			Medição: 4ª Medição Provisória			Data Assinat: 20/09/2011			Prazo Aditivo			853 dias	
Bairro: Zona Rural			Período de medição: 01/05/2014 a 30/05/2014			Convênio:			Prazo Restante			0 dias	
Município: Sorriso - MT			Período acumulado: 01/10/2011 a 30/05/2014						Valor do Contrato			2.888.724,64	
			Empresa: Constil Construções e Terrap. Ltda						Valor med acumul			2.784.081,54	
Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada					
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	% Exec		
1	TERRAPLENAGEM												
1.1	DESMAT, DESTOC E LIMPEZA ÁREAS COM ÁRVORES Ø ATÉ 0,15 M	M²	199.336,070	0,33	65.780,90		0,00	199.336,070	199.336,070	65.780,90	100,0%		
	Subtotal de Terraplenagem				65.780,90		0,00			65.780,90	100,0%		
2	PAVIMENTAÇÃO												
2.1	IMPRIMAÇÃO	M²	65.026,620	0,24	15.606,38		0,00	65.026,620	65.026,620	15.606,38	100,0%		
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	46.674,260	0,16	7.467,88		0,00	46.674,260	46.674,260	7.467,88	100,0%		
2.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M²	18.176,900	0,83	15.086,82		0,00	18.176,900	18.176,900	15.086,82	100,0%		
2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - COM TRANSP. COMER	TON	0,000	179,16	0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	TON	4.480,732	66,99	300.164,23		0,00	4.480,732	4.480,732	300.164,23	100,0%		
2.5	TRANSPORTE COMERCIAL EM BASC. 10 M³ ROD. PAVIM - MAT. P/ CBU	T.KM	894.952,339	0,36	322.182,84		0,00	894.952,339	894.952,339	322.182,84	100,0%		
2.6	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-20	TON	268,840	1.800,53	484.054,48		0,00	268,840	268,840	484.054,48	100,0%		
2.7	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	79,520	2.718,06	216.140,13		0,00	79,520	79,520	216.140,13	100,0%		
2.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	44,120	1.473,94	65.030,23		0,00	44,120	44,120	65.030,23	100,0%		
2.9	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-20	TON	268,840	176,36	47.412,62		0,00	268,840	268,840	47.412,62	100,0%		
2.10	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	79,520	176,36	14.024,14		0,00	79,520	79,520	14.024,14	100,0%		
2.11	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	44,120	176,36	7.781,00		0,00	44,120	44,120	7.781,00	100,0%		
2.12	TRANSP LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	44.809,687	0,55	24.645,32		0,00	44.809,687	44.809,687	24.645,32	100,0%		
2.13	TRANSPORTE COMERCIAL EM BAS. 10 M³ ROD. PAVIM. MAT. P/ TSS	T.KM	62.341,262	0,38	23.689,67		0,00	62.341,262	62.341,262	23.689,67	100,0%		
2.14	REESTABILIZAÇÃO GRANULOM DE SOLO COM ADIÇÃO DE MATERIAL	M³	11.704,790	7,03	82.284,67		0,00	11.704,790	11.704,790	82.284,67	100,0%		
2.15	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	169.719,480	0,55	93.345,71		0,00	169.719,480	169.719,480	93.345,71	100,0%		
	Subtotal serviços de Pavimentação				1.718.916,12		0,00			1.718.916,12	100,0%		
3	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA												
3.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/ REVEST VEGETAL VPA 01	M	420,000	77,52	32.558,40		0,00	420,000	420,000	32.558,40	100,0%		
3.2	ESCAV MECAN. REATERRO E COMPAC DE MATERIAL DE 1ª CAT	M³	22,000	9,34	205,48		0,00	22,000	22,000	205,48	100,0%		
3.3	CORPO DE BUEIRO - BSTD DN 0,60 M	M	11,000	338,43	3.722,73		0,00	11,000	11,000	3.722,73	100,0%		
3.4	BOCA DE BUEIRO - BSTD DN 0,60 M	UNID	2,000	765,47	1.530,94		0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
	Subtotal de Drenagem				38.017,55		0,00			36.486,61	96,0%		
4	SINALIZAÇÃO												
4.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	5.619,350	20,13	113.117,51	0,000	0,00	5.619,350	5.619,350	113.117,51	100,0%		
	Subtotal de pavimentação				113.117,51		0,00			113.117,51	100,0%		
5	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
5.1	HIDROSSEMEADURA	M²	80.000,000	1,40	112.000,00	0,000	0,00	80.000,000	80.000,000	112.000,00	100,0%		
5.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS P/ ESCOAM/ ÁGUA CX EMPRÉST.	M³	18.200,000	5,00	91.000,00	0,000	0,00	18.200,000	18.200,000	91.000,00	100,0%		
5.3	ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS CXS DE ESPRÉSTIMO	M³	11.993,652	6,26	75.080,26	0,000	0,00	11.993,652	11.993,652	75.080,26	100,0%		
	Subtotal de Recuperação do Meio Ambiente				278.080,26		0,00			278.080,26	100,0%		
6	SINALIZAÇÃO LUMINOSA												
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO COMPACTAÇÃO MATERIAL 1ª CAT	M³	500,000	43,93	21.965,00	250,000	10.982,50	250,000	500,000	21.965,00	100,0%		
6.2	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=50MM	M	630,000	15,66	9.865,80	315,000	4.932,90	315,000	630,000	9.865,80	100,0%		
6.3	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=75MM	M	3.910,000	18,02	70.458,20	1.955,000	35.229,10	1.955,000	3.910,000	70.458,20	100,0%		
6.4	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=100MM	M	412,000	23,81	9.809,72	206,000	4.904,86	206,000	412,000	9.809,72	100,0%		
6.5	RECOMPOSIÇÃO DO TERRENO	M³	350,000	25,66	8.981,00	175,000	4.490,50	175,000	350,000	8.981,00	100,0%		
6.6	CAIXAS DE CONCRETO	UNID	16,000	331,68	5.306,88	8,000	2.653,44	8,000	16,000	5.306,88	100,0%		
6.7	MACIÇOS DE CONCRETO	UNID	87,000	160,34	13.949,58	43,500	6.974,79	43,500	87,000	13.949,58	100,0%		
6.8	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	UNID	1,000	674,66	674,66	0,500	337,33	0,500	1,000	674,66	100,0%		
6.9	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 2	UNID	7,000	643,62	4.505,34	3,500	2.252,67	3,500	7,000	4.505,34	100,0%		
6.10	CAIXAS DE INSPEÇÃO	UNID	91,000	565,62	51.471,42	45,500	25.735,71	45,500	91,000	51.471,42	100,0%		
6.11	POÇOS DE ATERRAMENTO	UNID	17,000	550,66	9.361,22	8,500	4.680,61	8,500	17,000	9.361,22	100,0%		
6.12	LANÇAMENTO DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO E LIGAÇÕES	M	5.440,000	2,20	11.968,00	2.720,000	5.984,00	2.720,000	5.440,000	11.968,00	100,0%		
6.13	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO (16,0 M²)	M²	16,000	1.424,55	22.792,80	8,000	11.396,40	8,000	16,000	22.792,80	100,0%		
	BALIZAMENTO												
6.14	LANÇAMENTO DOS CABOS DOS CIRCUITOS	M	4.500,000	12,19	54.855,00	2.250,000	27.427,50	2.250,000	4.500,000	54.855,00	100,0%		
6.15	INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUZ	UNID	103,000	1.091,67	112.442,01	103,000	112.442,01	0,000	103,000	112.442,01	100,0%		
6.16	LANÇAMENTO DOS CABOS DE CONTROLE	M	350,000	40,68	14.238,00	175,000	7.119,00	175,000	350,000	14.238,00	100,0%		
6.17	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA												
6.18	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO 10 KW, 01 RCC 10 KW, CONTROLES DO FAROL E DA BIRUTA E ACESSÓRIOS	CJ	1,000	62.618,39	62.618,39	1,000	62.618,39	0,000	1,000	62.618,39	100,0%		
6.19	GRUPO-GERADOR TRIFÁSICO, 220 V, 27 KVA	CJ	1,000	45.865,48	45.865,48	-1,000	-45.865,48	1,000	0,000	0,00	0,0%		
6.20	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (30 KVA)	CJ	1,000	11.396,52	11.396,52	1,000	11.396,52	0,000	1,000	11.396,52	100,0%		
6.21	INSTALAÇÃO DE POSTE E MONTAGEM DO FAROL DE AERÓDROMO	CJ	1,000	65.809,43	65.809,43	1,000	65.809,43	0,000	1,000	65.809,43	100,0%		
6.22	MONTAGEM DA BIRUTA ILUMINADA	CJ	1,000	9.231,17	9.231,17	1,000	9.231,17	0,000	1,000	9.231,17	100,0%		
	Subtotal de drenagem de águas pluviais				617.565,62		370.733,35			571.700,14	92,6%		
7.1	TREVO DE ACESSO												
7.1.1	OBRAS COMPLEMENTARES												
7.2	ENLEIAMENTO	M²	1.368,140	6,40	8.756,09	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.2.1	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE												
7.2.1	ESCAV MECAN. REATERRO E COMPAC DE MATERIAL DE 1ª CAT	M³	120,170	9,34	1.122,38	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.2.2	MEIO FIO - MFC - 03	M	950,460	22,87	21.737,02	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.2.3	DESCIDA D'ÁGUA DAR-02	M	17,000	68,07	1.157,19	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.2.4	ENTRADA D'ÁGUA EDA-01	M	6,000	34,33	205,98	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.2.5	DISSIPADOR DE ENERGIA DED-01	UNID.	6,000	243,71	1.462,26	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.3	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA												
7.3.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	414,750	21,13	8.763,66	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.3.2	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHAS REFLET. BIDIRECIONAIS	UNID.	380,000	17,37	6.600,60	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.3.3	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHOS REFLET. BIDIRECIONAIS	UNID.	83,000	43,76	3.632,08	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
7.3.4	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE PLACAS TOTAL/REFLETIVAS	M²	12,130	314,05	3.809,42	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%		
	Subtotal Trevo de Acesso				57.246,68		0,00			0,00	0,0%		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO






RESUMO DE MEDIÇÃO


SINFRA






Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso			Ordem de início de serviço: 20/09/2011			Nº Contrato: 064/2011		Prazo de Execução Inicial			120 dias
Local: Aeroporto Municipal			Medição: 4ª Medição Provisória			Data Assinat: 20/09/2011		Prazo Aditivo			853 dias
Bairro: Zona Rural			Período de medição: 01/05/2014 a 30/05/2014			Convênio:		Prazo Restante			0 dias
Município: Sorriso - MT			Período acumulado: 01/10/2011 a 30/05/2014			Empresa: Constil Construções e Terrap. Ltda		Valor do Contrato			2.888.724,64
								Valor med acumul			2.784.081,54
Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada			
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	% Exec
	Total				2.888.724,64		370.733,35			2.784.081,54	96,4%
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em						R\$370.733,35 (Trezentos e setenta mil setecentos e trinta e tres reais e trinta e cinco centavos)					
Local/Data Sorriso/MT, 05 de Junho de 2014											




**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONTRATO 064/2011: PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO TREVO DE ACESSO NO
AEROPORTO**

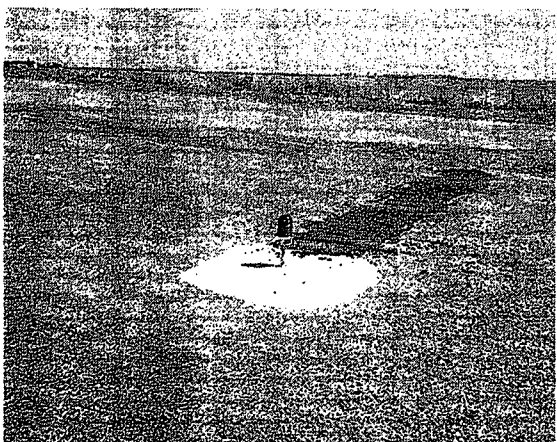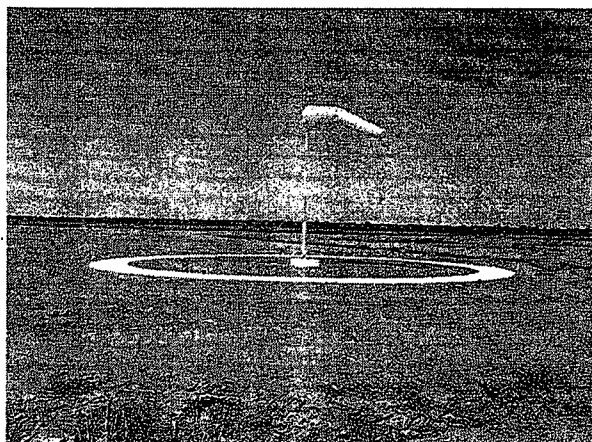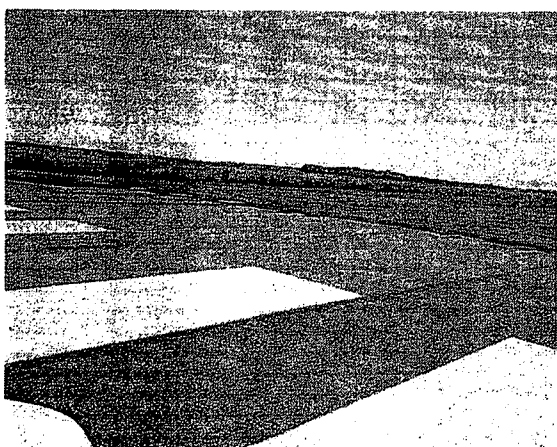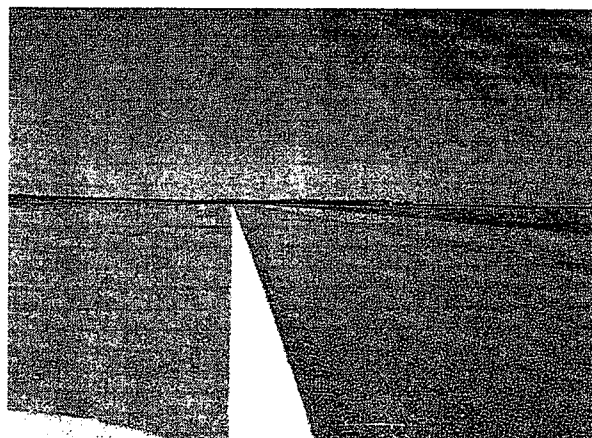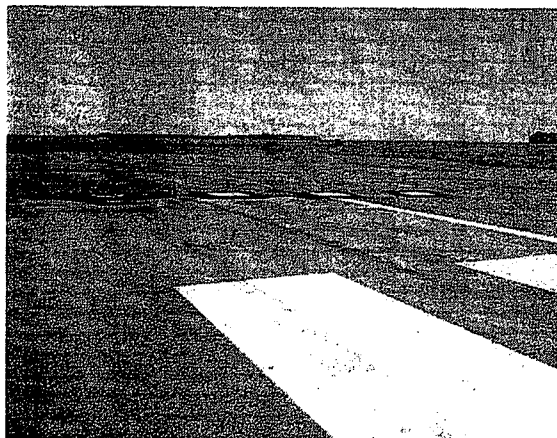


Luciano C. Seaburi
Eng. Civil. – Fiscalização

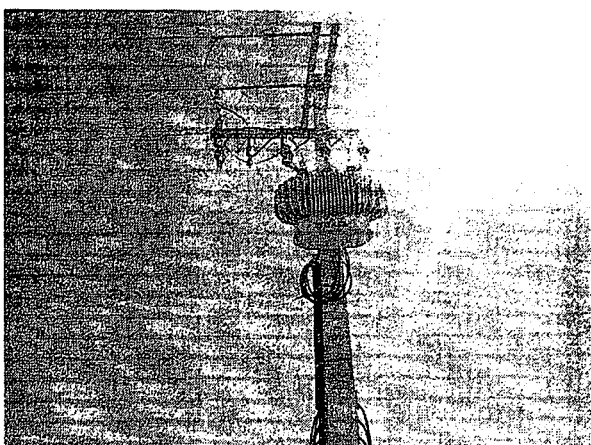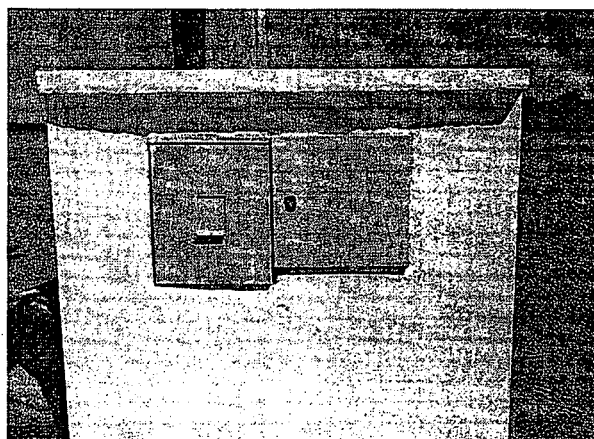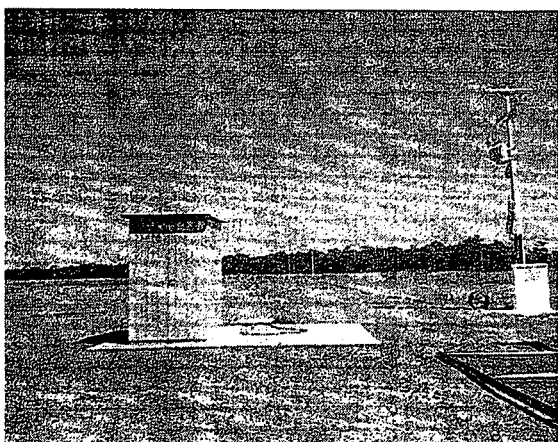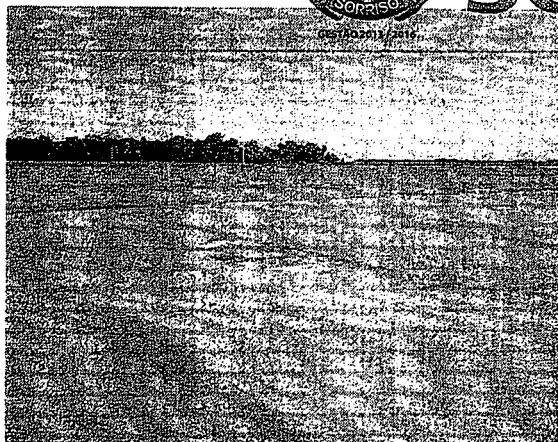


Luciano C. Scaburi
Eng. Civil. - Fiscalização



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Objeto: Pavimentação, Asfaltação, drenagem e limpeza de terreno

Local: Assentamento Municipal

Bairro: Zona Rural

Município: Sorriso - MT

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Orçamento de Início de Vigor: 30/09/2011	Orçamento 054/2011	Prazo de Execução Inicial: 120 dias
Medição: 3ª Medição Provisória	Data Assinada: 20/09/2011	Prazo Aditivo: 230 dias
Período de Medição: 01/12/2011 a 30/04/2012	Assinatura: [Assinatura]	Prazo Resíduo: 18 dias
Períodos acumulados: 01/12/2011 a 30/04/2012	Valor do Contrato: 2.888.724,64	
Empresa: Constil Construções e Terrap. Ltda	Valor Medido Acumul.: 2.413.348,19	

Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual			Medição Acumulada			% Exec
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor		Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	
1	TERRAPLENAGEM	M³	199.336,070	0,33	65.780,90	9.336,070	3.080,90		199.336,070	199.336,070	65.780,90	100,0%
1.1	INDICAT. DESTOC E LIMPEZA ÁREAS COM ÁRVORES O ATE 0,15 M				65.780,90		3.080,90				65.780,90	100,0%
	Subtotal de Terraplenagem				65.780,90						65.780,90	
2	PAVIMENTAÇÃO	M²	65.024,670	0,24	15.606,38	1.273,790	2.465,720		64.750,880	65.024,670	15.606,38	100,0%
2.1	PAV. EM LIG. DE CIMENTO	M²	46.624,380	0,16	7.460,30	8.649,430	1.383,590		38.974,950	46.624,380	7.460,30	100,0%
2.2	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	M²	18.176,900	0,83	15.086,82	1.006,320	2.580,730		17.170,580	18.176,900	15.086,82	100,0%
2.3	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	0,000	79,16	0,00	0,000	0,000		0,000	0,000	0,00	0,0%
2.4	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	4.480,000	66,99	300.154,73	870,352	55.625,27		3.609,648	4.480,000	300.154,73	100,0%
2.5	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	894.952,119	0,36	322.187,80	67.212,608	34.996,530		797.739,511	894.952,119	322.187,80	100,0%
2.6	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	265,540	800,53	484.054,48	49,817	89.696,960		215,723	265,540	484.054,48	100,0%
2.7	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	79,500	2.718,06	216.140,13	36,683	99.707,690		42,817	79,500	216.140,13	100,0%
2.8	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	44,100	1.473,94	65.030,23	7,815	11.519,520		36,285	44,100	65.030,23	100,0%
2.9	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	268,540	176,36	47.412,62	4,817	8.785,720		263,723	268,540	47.412,62	100,0%
2.10	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	79,500	176,36	14.024,44	36,683	6.469,480		42,817	79,500	14.024,44	100,0%
2.11	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	44,100	176,36	7.780,38	7,815	1.378,330		36,285	44,100	7.780,38	100,0%
2.12	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	44.809,680	0,55	24.645,32	8.305,850	4.568,210		36.503,830	44.809,680	24.645,32	100,0%
2.13	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	67.341,260	0,38	23.689,67	67.341,262	23.689,670		0,000	67.341,262	23.689,670	100,0%
2.14	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	M²	11.704,790	7,03	82.284,67	254,253	1.998,290		11.450,537	11.704,790	82.284,67	100,0%
2.15	PAV. EM LIG. DE CIMENTO COM TRANS. DE CIMENTO	TON	169.719,480	0,55	93.345,71	0,000	0,000		169.719,480	169.719,480	93.345,71	100,0%
	Subtotal serviços de Pavimentação				1.718.916,12		344.866,00				1.718.916,12	100,0%
3	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	M	420,000	77,59	32.558,40	420,000	32.558,400		0,000	420,000	32.558,400	100,0%
3.1	VAL. DE PROTEÇÃO DE TERRO E REVEST. VEGET. VPA 0,1	M	20,000	9,14	200,48	22,000	200,480		0,000	22,000	200,480	100,0%
3.2	VAL. DE PROTEÇÃO DE TERRO E REVEST. VEGET. VPA 0,1	M	11,000	38,43	422,73	11,000	422,730		0,000	11,000	422,730	100,0%
3.3	BOCA DE BUEIRO - ESTC DN 0,60 M	UNID	2,000	765,47	1.530,94	2,000	1.530,940		0,000	2,000	1.530,940	100,0%
	Subtotal de Drenagem				38.017,55		36.486,61				36.486,61	96,0%

Emiliano Pereira


Assessor Adjunto

Prefeitura Municipal de Sorriso

Luciano S. Seaburi

Engenheiro Civil

CPF: A 170072978-4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORISO

R

Ordem de medição de serviço 20/05/2011
Medição: 3ª Medição Provisória
Período de medição: 01/12/2011 a 30/04/2012
Período de execução: 01/10/2011 a 30/04/2012
Empresa: Constil Construções e

Código	Descrição	Unid	Quantid	Prego Unit
4	SINALIZAÇÃO			
4.1	PINTURA DE FAIXA - LATA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	5.619,350	20,13
Subtotal de pavimentação				
5	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
5.1	HIDROSSEMENTAÇÃO	M³	80.000,000	1,40
5.2	ESCALVAÇÃO DE VAZAS E ESCOAM. ÁGUA CX EMPREST	M³	16.000,000	5,00
5.3	ESCALVAÇÃO E REESTABILIZAÇÃO DAS CIX DE ESPRÉSTIMO	M³	11.000,000	1,00
Subtotal de Recuperação do Meio Ambiente				
6	SINALIZAÇÃO LUMINOSA			
6.1	ESCALVAÇÃO MANUAL REATERRO COMPACTAÇÃO MATERIAL 12 CM	M²	100,000	11,50
6.2	INSTALAÇÃO RIGID. E LINHAS DE DUTOS PVC 150MM	M	6.000,000	10,60
6.3	INSTALAÇÃO RIGID. E LINHAS DE DUTOS PVC 175MM	M	3.900,000	18,00
6.4	INSTALAÇÃO RIGID. E LINHAS DE DUTOS PVC 100MM	M	412,000	7,50
6.5	RECOMPOSIÇÃO DO TERRENO	M²	350,000	25,00
6.6	CAIXAS DE CONCRETO	UNID	16,000	33,00
6.7	MACIÇOS DE CONCRETO	UNID	87,000	160,00
6.8	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	UNID	1,000	67,00
6.9	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 2	UNID	1,000	67,00
6.10	CAIXAS DE INSPEÇÃO	UNID	1,000	64,00
6.11	POÇOS DE ATERRAMENTO	UNID	51,000	56,00
6.12	LANÇAMENTO DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO E LIGAÇÕES	UNID	17,000	55,00
6.13	CONSTRUTÃO DE SUBESTAÇÃO 1160 MVA	M²	19,000	1,40
BALIZAMENTO				
6.14	LANÇAMENTO DE CORDÃO DE LUMINOSIDADE	M	1.000,000	1,00
6.15	INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUZ	UNID	1.000,000	1,00
6.16	LANÇAMENTO DOS CABOS DE CONTROLE	M	150,000	1,00

Medição Acumulada
Medido Cumul
A

0,000
1,000
0,000
0,000
0,000

SIN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORISO

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Orçamento Anual de 2011 - Dotação e Previsão de Despesa

Art. 166, inciso I, da Constituição Federal

Bairro: Zona Rural

Município: Soriso - MT

Orçamento Anual de 2011 - Dotação e Previsão de Despesa

Medição: 3ª Medição Provisória

Período de Medição: 01/01/2011 a 30/04/2012

Período atualizado: 01/01/2011 a 30/04/2012

Empresa: Constil Construções e Terrap Ltda

Ano: 2011

Data Assinatura: 20/05/2011

Código

Plano de Execução Orçamentária

Plano de Execução

Plano de Execução

Valor Med. Anterior

Valor Med. Atual

Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual			Medição Acumulada				% Exec
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado			
4	SINALIZAÇÃO												
4.1	SINALIZAÇÃO - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	5.619,350	20,17	113.117,51	5.619,350	113.117,51	0,000	5.619,350	113.117,51	100,0%		
	Subtotal de pavimentação				113.117,51		113.117,51						
5	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
5.1	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	M²	80.000,000	1,40	112.000,00	80.000,000	112.000,00	0,000	80.000,000	112.000,00	100,0%		
5.2	ESCVAVAÇÃO DE VAZÃO E ESCOAMENTO DA ENFREST	M²	16.000,000	5,62	91.000,00	16.000,000	91.000,00	0,000	16.000,000	91.000,00	100,0%		
5.3	ESCVAVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS LIXAS DE ESPRINTING	M²	11.993,652	6,25	75.080,26	11.993,652	75.080,26	0,000	11.993,652	75.080,26	100,0%		
	Subtotal de Recuperação do Meio Ambiente				278.080,26		278.080,26						
6	SINALIZAÇÃO LUMINOSA												
6.1	ESCAVAÇÃO VAZÃO, MATERIO, CONCRETAÇÃO MATERIAL, LIXAS	M²	300,000	43,53	13.059,00	300,000	13.059,00	0,000	300,000	13.059,00	100,0%		
6.2	INSTALAÇÃO DE LIXAS DE DUTOS PVC 100MM	M	610,000	11,66	7.116,60	610,000	7.116,60	0,000	610,000	7.116,60	100,0%		
6.3	INSTALAÇÃO DE LIXAS DE DUTOS PVC 100MM	M	3.910,000	18,02	70.458,20	3.910,000	70.458,20	0,000	3.910,000	70.458,20	100,0%		
6.4	RECUPERAÇÃO DO TERRENO	M²	411,000	21,81	8.965,22	411,000	8.965,22	0,000	411,000	8.965,22	100,0%		
6.5	CAIXAS DE CONCRETO	M³	350,000	25,86	9.051,00	350,000	9.051,00	0,000	350,000	9.051,00	100,0%		
6.6	CAIXAS DE CONCRETO	M³	15,000	311,68	4.675,20	15,000	4.675,20	0,000	15,000	4.675,20	100,0%		
6.7	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	UNID	52,000	160,34	8.336,68	52,000	8.336,68	0,000	52,000	8.336,68	100,0%		
6.8	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 2	UNID	1,000	624,65	624,65	1,000	624,65	0,000	1,000	624,65	100,0%		
6.9	CAIXAS DE INSPEÇÃO	UNID	7,000	643,62	4.505,34	7,000	4.505,34	0,000	7,000	4.505,34	100,0%		
6.10	POÇOS DE ATERRAMENTO	UNID	51,000	561,62	28.662,72	51,000	28.662,72	0,000	51,000	28.662,72	100,0%		
6.11	LIGAMENTO DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO E LIGAÇÕES	M	11,000	550,96	6.060,56	11,000	6.060,56	0,000	11,000	6.060,56	100,0%		
6.12	CONSTRUTÃO DE SUBEST. 100,00 M²	M²	5.440,000	3,20	17.408,00	5.440,000	17.408,00	0,000	5.440,000	17.408,00	100,0%		
	BALIZAMENTO												
6.13	ASSINAMENTO DE LIXAS DE DUTOS PVC 100MM	M	4.410,000	11,59	51.039,00	4.410,000	51.039,00	0,000	4.410,000	51.039,00	100,0%		
6.14	INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUX	UNID	11,000	1.091,67	12.008,37	11,000	12.008,37	0,000	11,000	12.008,37	100,0%		
6.15	LIGAMENTO DOS CABOS DE CONTROLE	M	180,000	40,08	7.214,40	180,000	7.214,40	0,000	180,000	7.214,40	100,0%		

Emiliano Pereira

Assessor Adjunto

Prefeitura Municipal de Soriso


Luciano Z. Seabra

Engenheiro Civil

CREA 170072978-4

SINFRA

Emiliano Prema
Assessor Adjunto
Prefeitura Municipal de Somso



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.239.076/0001-62

Av Porto Alegre
Centro
Fone: 06635454700

Nº.: 0002525
CEP: 78890000
Fax: 00000000000
www.sorriso.mt.gov.br

Data: 03/01/2012
Hora: 11:42:38
Pág: 001

Solicitação 21/2012 - Deferida

Solicitada em 03/01/2012

Deferida em 03/01/2012

Requerente 2121 - ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Local 46 - SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO
Utilização SOLICITO EMPENHO DE 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 064/2011 PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E TREVO DE ACESSO DO AEROPORTO MUNICIPAL.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		Quantidade	Dot.
			Solicitada	Estimado	Valor Total	Deferida	
086553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO	SERVICO	1,0000	1.185.830,3800	1.185.830,3800	1,0000	
Totais			1,0000		1.185.830,3800	1,0000	

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA

Luciano C. Scaburi
Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4

LANÇADO
11/01/2012

Constil Construções e Terraplenagem Ltda Constil Construções e Terraplenagem Ltda Rua 15 de Maio, 510 - Marechal Rondon CEP 78140-410 - (65) 36883700 - Várzea Grande - MT Inscrição Municipal: 16691 - CPF/CNPJ: 15.958.721/0001-86		Tipo de Documento NFE - Série Digital
		Nº da Nota Eletrônica 279

 Prefeitura Municipal de Várzea Grande Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (65) 3688-3000 - www.varzeagrande.mt.gov.br	DT. DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	TRIBUTADO NO MUNICÍPIO
	31/2012	Prestação de Serviços	Não

Razão Social Prefeitura Municipal de Sorriso		Número de Controle do Município 	
Nome Fantasia Prefeitura Municipal de Sorriso			
Endereço Avenida Porto Alegre, 2525 -			
Cidade Sorriso	UF MT	Fone (66)3545-8000	Fax (66)3545-4700
		Cep 78890-000	
Bairro Centro	E-mail solenirgobbi@hotmail.com		
CPF/CNPJ 03.239.076/0001-62	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

SERVIÇO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. %	ISSQN	RETIDO
Sim	1,0000	2A. Medição Provisória dos Serviços de Execução de Obras No Aeroporto Municipal: Pavimentação Asfáltica, Sinalização e Construção de Trevo de Acesso - Cor.Pública 003.2011. Período 01/11/2011 a 30.11.2011.	1.185.830,38	1.185.830,38	2,00	23.716,61	Sim
Sim	1,0000	Contrato: 064.2011 Cei: 70.007.17313.71 Base Calculo Issqn: 60% Aplicação Material R\$ 711.498,23 40% Aplicação Mão de Obra R\$ 474.332,15 Base Calculo Previdência: 10% Pavimentação R\$ 118.583,04 11% Retenção Seguridade Social R\$ 13.044,13. Serviços Executados Município Sorriso Mt.	0,00	0	2,00	0,00	Sim

Deduções

ISSQN Retido	PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS
23.716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,13
Base de cálculo do ISSQN	ISSQN sem Retenção	Total do ISSQN		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 1.185.830,38
1.185.830,38	0,00	0,00		VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL	R\$ 1.149.069,64

Informações Complementares

- PROCON - Várzea Grande - MT Av. Castelo Branco Nº 325 CEP: 78110-000 Fone: (65) 3688-3681

Transportadora	CNPJ/CPF	Endereço
Frete por Conta	Quantidade	Espécie
	Peso líquido	Peso bruto

	Impressão da Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: www.issnetonline.com.br - Chave de identificação: AA-8A-6D-4C-A2-72-A2-53-F7-5F-62-8B-FE-A4-B8-A0

Recebi(emos) de Constil Construções e Terraplenagem Ltda os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado: _____ Data	Identificação e Assinatura do Recebedor _____ 		Número de Controle do Município 
		Tipo de Documento NFE - Série Digital	
		Nº Nota Fiscal Eletrônica 279	

	Impressão da Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: www.issnetonline.com.br - Chave de identificação: AA-8A-6D-4C-A2-72-A2-53-F7-5F-62-8B-FE-A4-B8-A0

ISS.NET - Nota Control Tecnologia Ltda • www.notacontrol.com.br • Fone (65)3682-8000

Imprimir


Fechar

Enviar por E-mail

Atesto e recebimento do(s) Material(ais)

Serviço(s) da(e) presente

Em 03, 01, 2012



Luciano C. Scaburi

Engenheiro Civil

CREA 170072976-4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso	Ordem de início de serviço: 20/09/2011	Nº Contrato: 064/2011	Prazo de Execução: 120 dias
Local: Aeroporto Municipal	Medição: 2ª Medição Provisória	Data Assinat: 20/09/2011	Prazo Restante: 81 dias
Bairro: Zona Rural	Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011	Convênio:	Valor do Contrato: 2.888.724,64
Município: Sorriso - MT	Período acumulado: 01/10/2011 a 30/11/2011	Empresa: Constil	Valor med acumul: 1.602.830,53

Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada			
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	% Exec
1	TERRAPLENAGEM										
1.1	DESMAT, DESTOC E LIMPEZA ÁREAS COM ÁRVORES Ø ATÉ 0,15 M	MP	199.336,070	0,33	65.780,90	0,000	0,00	190.000,000	190.000,000	62.700,00	0,0%
	Subtotal de Terraplenagem				65.780,90		0,00			62.700,00	0,0%
2	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	IMPRIMAÇÃO	MP	65.026,620	0,24	15.606,38	35.696,830	8.567,23	19.056,000	54.752,830	13.140,67	84,2%
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	MP	46.674,260	0,16	7.467,88	38.024,830	6.083,97	0,000	38.024,830	6.083,97	81,5%
2.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	MP	18.176,900	0,83	15.086,82	15.067,580	12.506,09	0,000	15.067,580	12.506,09	82,9%
2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - COM TRANSP. COMERC	TON	0,000	179,16	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	TON	4.480,732	66,99	300.164,23	3.650,384	244.539,20	0,000	3.650,384	244.539,20	81,5%
2.5	TRANSPORTE COMERCIAL EM BASC. 10 M³ ROD. PAVIM - MAT. P/ CBUQ	T.KM	894.952,339	0,36	322.182,84	797.739,731	287.186,30	0,000	797.739,731	287.186,30	89,1%
2.6	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-20	TON	268,840	1.800,53	484.054,48	219,023	394.357,51	0,000	219,023	394.357,51	81,5%
2.7	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	79,520	2.718,06	216.140,13	19,969	54.278,01	22,867	42,837	116.432,43	53,9%
2.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	44,120	1.473,94	65.030,23	36,305	53.510,70	0,000	36,305	53.510,70	82,3%
2.9	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-20	TON	268,840	176,36	47.412,62	219,023	38.626,89	0,000	219,023	38.626,89	81,5%
2.10	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	79,520	176,36	14.024,14	19,969	3.521,80	22,867	42,837	7.554,66	53,9%
2.11	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	44,120	176,36	7.781,00	36,305	6.402,66	0,000	36,305	6.402,66	82,3%
2.12	TRANSP LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	44.809,687	0,55	24.645,32	36.503,837	20.077,11	0,000	36.503,837	20.077,11	81,5%
2.13	TRANSPORTE COMERCIAL EM BAS. 10 M³ ROD. PAVIM. MAT. P/ TSS	T.KM	62.341,262	0,38	23.689,67	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.14	REESTABILIZAÇÃO GRANULOM DE SOLO COM ADIÇÃO DE MATERIAL	MP	11.704,790	7,03	82.284,67	7.990,457	56.172,91	3.430,080	11.420,537	80.286,37	97,6%
2.15	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	169.719,480	0,55	93.345,71	0,000	0,00	169.719,478	169.719,478	93.345,71	100,0%
	Subtotal serviços de Pavimentação				1.718.916,12		1.185.830,38			1.374.050,27	79,9%
3	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA										
3.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/ REVEST VEGETAL VPA 01	M	420,000	77,52	32.558,40	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
3.2	ESCAV MECAN, REATERRO E COMPAC DE MATERIAL DE 1ª CAT	M³	22,000	9,34	205,48	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
3.3	CORPO DE BUEIRO - BSTC DN 0,60 M	M	11,000	338,43	3.722,73	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
3.4	BOCA DE BUEIRO - BSTC DN 0,60 M	UNID	2,000	765,47	1.530,94	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
	Subtotal de Drenagem				38.017,55		0,00			0,00	0,0%



SINFRA

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso	Ordem de Início de serviço: 20/09/2011	Nº Contrato: 064/2011	Prazo de Execução: 120 dias
Local: Aeroporto Municipal	Medição: 2ª Medição Provisória	Data Assinat: 20/09/2011	Prazo Restante: 81 dias
Bairro: Zona Rural	Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011	Convênio:	Valor do Contrato: 2.888.724,64
Município: Sorriso - MT	Período acumulado: 01/10/2011 a 30/11/2011	Empresa: Constil	Valor med acumul: 1.602.830,53

Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada			
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	% Exec
6.17	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA										
	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO 10 KW, 01 RCC 10 KW, CONTROLES DO FAROL E DA BIRUTA E ACESSÓRIOS	CJ	1,000	62.618,39	62.618,39	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.18	GRUPO-GERADOR TRIFÁSICO, 220 V, 27 KVA	CJ	1,000	45.865,48	45.865,48	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.19	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (30 KVA)	CJ	1,000	11.396,52	11.396,52	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.20	INSTALAÇÃO DE POSTE E MONTAGEM DO FAROL DE AERÓDROMO	CJ	1,000	65.809,43	65.809,43	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.21	MONTAGEM DA BIRUTA ILUMINADA	CJ	1,000	9.231,17	9.231,17	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
	Subtotal da drenagem de águas pluviais				617.565,62		0,00			0,00	0,0%
	TREVO DE ACESSO										
7.1	OBRAS COMPLEMENTARES										
7.1.1	ENLEIVAMENTO	M²	1.368,140	6,40	8.756,09	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE										
7.2.1	ESCAV MECAN, REATERRO E COMPAC DE MATERIAL DE 1ª CAT	M³	120,170	9,34	1.122,38	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2.2	MEIO FIO - MFC - 03	M	950,460	22,87	21.737,02	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2.3	DESCIDA D'ÁGUA DAR-02	M	17,000	68,07	1.157,19	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2.4	ENTRADA D'ÁGUA EDA-01	M	6,000	34,33	205,98	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2.5	DISSIPADOR DE ENERGIA DED-01	UNID.	6,000	243,71	1.462,26	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.3	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA										
7.3.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	414,750	21,13	8.763,66	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.3.2	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHAS REFLET. BIDIRECIONAIS	UNID.	380,000	17,37	6.600,60	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.3.3	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHÕES REFLET. BIDIRECIONAIS	UNID.	83,000	43,76	3.632,08	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.3.4	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE PLACAS TOTALM.REFLETIVAS	M²	12,130	314,05	3.809,42	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
	Subtotal Trevo de Acesso				57.246,68		0,00			0,00	0,0%
	Total				2.888.724,64		1.185.830,38			607.995,53	20,35%

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em

R\$1.185.830,38

(hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito centavos)

Local/Data: Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

Prefeitura Municipal de Sorriso
APPROVADO
03/JAN. 2012
Luciano C. Scaburi
Engenheiro CIVIL CREA 170072976-4
Departamento de Engenharia

Figure 1

3. *Phylogenetic relationships*—The phylogenetic relationships of the studied species were determined using the maximum parsimony method. The analysis was performed using the program PAUP 4.0 (Swofford, 1999). The parsimony analysis was based on the morphological characters of the studied species. The characters were coded as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 8

2000



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Ordem de início de serviço: 20/09/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

2.1 Imprimação
(m²)

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)					OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000					1.a Med Provis - Outubro-2011
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	20,000	6.400,000					1.a Med Provis - Outubro-2011
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	10,000	5.600,000					1.a Med Provis - Outubro-2011
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	15,000	3.528,000					
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	25,000	8.000,000					
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	35,000	19.600,000					
				1.137,430					Stop-Way - Cabeceira 22
Pátio de estacionamento de aeronave		129,000	26,600	3.431,400					Pátio Estacionamento
Total - Medição Acumulada				54.752,830					
Total - Medição Acum Anterior				19.056,000					
Total - Medição Atual				35.696,830					

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

2.2 Pintura de Ligação
(m2)

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)					OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000					Stop-Way - Cabeceira 22
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	30,000	9.600,000					
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	30,000	16.800,000					
				1.137,430					
Pátio de estacionamento de aeronave		129,000	26,600	3.431,400					Pátio Estacionamento
Total - Medição Acumulada				38.024,830					
Total - Medição Acum Anterior				0,000					
Total - Medição Atual				38.024,830					

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO
2.3 Tratamento Superficial
Simplex
(M2)

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	Densidade (Ton/m³)	Peso (Ton)	OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
30,00 + 0,00	85,00 + 0,00	1.100,000	7,500	8.250,00	0,000	0,000		0,000	Pista pouso - Lado Direito Pista pouso - Lado Esquerdo após curvatura taxiway
39,00 + 10,99	85,00 + 0,00	909,010	7,500	6.817,58	0,000	0,000		0,000	
Total - Medição Acumulada				15.067,58					
Total - Medição Acum Anterior				0,00					
Total - Medição Atual				15.067,58					

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

2.5 Transporte Comercial em
basculante 10 m3
(T.km)

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	CBUQ (ton)	Ton/t (t)	DMT (km)	Transporte (T.km)	OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.									
29,00 + 4,80	85,00 + 0,00	1.115,200	30,000	33.456,000	0,040	3.211,776	0,02800	257,500	23.156,905	Filler - Pista de Pouso
29,00 + 4,80	85,00 + 0,00	1.115,200	30,000	33.456,000	0,040	3.211,776	0,24200	20,000	15.544,996	Areia - Pista de Pouso
29,00 + 4,80	85,00 + 0,00	1.115,200	30,000	33.456,000	0,040	3.211,776	0,67050	279,900	602.763,477	Brita - Pista de Pouso
				1.137,430	0,040	109,193	0,67050	257,500	18.852,629	Filler - Stop Way - Cabeceira 22
				1.137,430	0,040	109,193	0,24200	20,000	528,495	Areia - Stop Way - Cabeceira 22
				1.137,430	0,040	109,193	0,67050	279,900	20.492,625	Brita - Stop Way - Cabeceira 22
Brita para TSS: Pedreira - Obra										
30,00 + 0,00	85,00 + 0,00	1.100,000	7,500	8.250,00		0,000	0,01200	279,900	27.710,100	Brita -TSS
39,00 + 10,89	85,00 + 0,00	909,010	7,500	6.817,58		0,000	0,01200	279,900	22.898,888	Brita -TSS
Pátio de estacionamento de aeronave										
		129,000	26,600	3.431,400	0,040	329,414	0,02800	257,500	2.375,078	Filler - Pista de Pouso
		129,000	26,600	3.431,400	0,040	329,414	0,24200	20,000	1.594,366	Areia - Pista de Pouso
		129,000	26,600	3.431,400	0,040	329,414	0,67050	279,900	61.822,172	Brita - Pista de Pouso
Total - Medição Acumulada									797.739,731	
Total - Medição Acum Anterior									0,000	
Total - Medição Atual									797.739,731	

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Data Assinat: 20/09/2011

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

2.6 Aquisição de CAP

2.9 Transporte de CAP
(Ton)

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	Densid (Ton/m³)	Cap (Ton)	OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000	0,040	282,24	2,400	40,64	Pista
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	30,000	9.600,000	0,040	384,00	2,400	55,30	Pista
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	30,000	16.800,000	0,040	672,00	2,400	96,77	Pista
				1.137,430	0,040	45,50	2,400	6,55	Stop-Way -Cabeceira 22
Pátio de estacionamento de aeronave		129,00	26,60	3.431,40	0,040	137,26	2,400	19,76	Pátio Estacionamento
Total - Medição Acumulada								219,023	
Total - Medição Acum Anterior								0,000	
Total - Medição Atual								219,023	

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

-



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

2.4 Concreto Betuminoso
Usinado a Quente
(Ton)

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	Densidade (Ton/m³)	Peso (Ton)	OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000	0,040	282,240	2,400	677,376	Pista
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	30,000	9.600,000	0,040	384,000	2,400	921,600	Pista
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	30,000	16.800,000	0,040	672,000	2,400	1.612,800	Pista
				1.137,430	0,040	45,497	2,400	109,193	Stop-Way -Cabeceira 22
Pátio de estacionamento de aeronave		129,00	26,60	3.431,40	0,040	137,256	2,400	329,414	Pátio Estacionamento
Total - Medição Acumulada								3.650,384	
Total - Medição Acum Anterior								0,000	
Total - Medição Atual								3.650,384	

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e travo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

2.6 Aquisição de CM-30
2.10 Transporte de CM-30
(ton)

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Tx (l/m²)	Peso (ton)			OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000	1,200	8,467			1.a Med Provis - Outubro-2011
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	20,000	6.400,000	1,200	7,680			1.a Med Provis - Outubro-2011
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	10,000	5.600,000	1,200	6,720			1.a Med Provis - Outubro-2011
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	15,000	3.528,000	1,200	4,234			
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	25,000	8.000,000	1,200	9,600			
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	35,000	19.600,000	1,200	23,520			
				1.137,430	1,200	1,365			Stop-Way -Cabeceira 22
Pátio de estacionamento de aeronave		129,00	26,60	3.431,400	1,200	4,118			Pátio Estacionamento
Total - Medição Acumulada						42,836			
Total - Medição Acum Anterior						22,867			
Total - Medição Atual						19,969			

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

dc



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

2.8 Aquisição de RR-2C
2.11 Transporte de RR-2C
(Ton)

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Tx (l/m2)	Peso (ton)			OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
Emulsão asfáltica RR-2C para pintura de ligação									
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000	0,400	2,822			Pista de pouso
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	30,000	9.600,000	0,400	3,840			Pista de pouso
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	30,000	16.800,000	0,400	6,720			Pista de pouso
				1.137,430	0,400	0,455			Stop-Way -Cabeceira 22
Emulsão asfáltica RR-2C para tratamento superficial simples									
30,00 + 0,00	85,00 + 0,00	1.100,000	7,500	8.250,000	1,40	11,550			
39,00 + 10,99	85,00 + 0,00	909,010	7,500	6.817,575	1,40	9,545			
Pátio de estacionamento de aeronave									
		129,000	26,600	3.431,400	0,40	1,373			Pátio Estacionamento
Total - Medição Acumulada									
Total - Medição Acum Anterior									
Total - Medição Atual									

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO
2.12 Transporte Local em
Rodovia Pavimentada
(T.km)

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e travo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	Dens. Material (t/m³)	DMT (km)	Transporte (T.km)	OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.									
29,00 + 4,80	65,00 + 0,00	1.115,200	30,000	33.456,000 1.137,430	0,040 0,040	1.338,240 45,497	2,400 2,400	10,000 10,000	32.117,760 1.091,933	Pista de pouso - Transporte CBUQ Stop-Way -Cabeceira 22
Pátio de estacionamento de aeronave		129,000	26,600	3.431,400	0,040	137,256	2,400	10,000	3.294,144	Pátio Estacionamento
Total - Medição Acumulada									36.503,837	
Total - Medição Acum Anterior									0,000	
Total - Medição Atual									36.503,837	

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO
granul. de solo com adição
de material
(m³)

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e travo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 2ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 01/11/2011 a 30/11/2011


Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)			OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000	0,18	1.270,080			1.a Med Provis - Outubro-2011
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	20,000	6.400,000	0,18	1.152,000			1.a Med Provis - Outubro-2011
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	10,000	5.600,000	0,18	1.008,000			1.a Med Provis - Outubro-2011
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	15,000	3.528,000	0,18	635,040			Stop-Way -Cabecelra 22
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	25,000	8.000,000	0,18	1.440,000			
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	35,000	19.600,000	0,18	3.528,000			
				1.137,430	0,18	204,737			
Pátio de estacionamento de aeronave		129,000	94,000	12.126,000	0,18	2.182,680			Pátio Estacionamento
Total - Medição Acumulada						11.420,537			
Total - Medição Acum Anterior						3.430,080			
Total - Medição Atual						7.990,457			

Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.239.076/0001-62

Av Porto Alegre
Centro
Fone: 06635454700

Nº.: 0002525
CEP: 78890000
Fax: 00000000000
www.sorriso.mt.gov.br

Data: 18/11/2011
Hora: 15:54:00
Pág: 001

Solicitação 12783/2011 - Deferida

Solicitada em 18/11/2011

Deferida em 18/11/2011

Requerente 2121 - ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
Órgão: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Local 46 - SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO

Utilização SOLITICO LIBERAÇÃO DE 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO 064/2011 PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E TREVO DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL DE SORRISO.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total	Quantidade	Dot.
			Solicitada			Deferida	
086553	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS NO	SERVICO	1,0000	417.000,1400	417.000,1400	1,0000	
Totais			1,0000		417.000,1400	1,0000	

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA


Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4

LANÇADO

19/12/11

OBS: Demorei para lançar
pois não se tinha ART do
Eng. Luciano e Eng. Execução.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso	Ordem de início de serviço: 21/09/2011	Nº Contrato: 064/2011	Prazo de Execução: 120 dias
Local: Aeroporto Municipal	Medição: 1ª Medição Provisória	Data Assinat: 20/09/2011	Prazo Restante: 81 dias
Bairro: Zona Rural	Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011	Convênio:	Valor do Contrato: 2.888.724,64
Município: Sorriso - MT	Período acumulado: 22/09/2011 a 20/11/2011	Empresa: Constil	Valor med acumul: 417.000,14

Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada			
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	% Exec
1	TERRAPLENAGEM										
1.1	DESMAT, DESTOC E LIMPEZA ÁREAS COM ÁRVORES Ø ATÉ 0,15 M	MP	199.336,070	0,33	65.780,90	190.000,000	62.700,00	0,000	190.000,000	62.700,00	95,3%
	Subtotal de Terraplenagem				65.780,90		62.700,00	0,000		62.700,00	95,3%
2	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	IMPRIMAÇÃO	MP	65.026,620	0,24	15.606,38	19.056,000	4.573,44	0,000	19.056,000	4.573,44	29,3%
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	MP	46.674,260	0,16	7.467,88	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	MP	18.176,900	0,83	15.086,82	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - COM TRANSP. COMERC	TON	0,000	179,16	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	TON	4.480,732	66,99	300.164,23	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.5	TRANSPORTE COMERCIAL EM BASC. 10 M³ ROD. PAVIM - MAT. P/ CBUQ	T.KM	894.952,339	0,36	322.182,84	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.6	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-20	TON	268,840	1.800,53	484.054,48	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.7	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	79,520	2.718,06	216.140,13	22,867	62.154,42	0,000	22,867	62.154,42	28,8%
2.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	44,120	1.473,94	65.030,23	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.9	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-20	TON	268,840	176,36	47.412,62	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.10	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	79,520	176,36	14.024,14	22,867	4.032,85	0,000	22,867	4.032,85	28,8%
2.11	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TON	44,120	176,36	7.781,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.12	TRANSP LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	44.809,687	0,55	24.645,32	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.13	TRANSPORTE COMERCIAL EM BAS. 10 M³ ROD. PAVIM. MAT. P/ TSS	T.KM	62.341,262	0,38	23.689,67	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.14	REESTABILIZAÇÃO GRANULOM DE SOLO COM ADIÇÃO DE MATERIAL	MP	11.704,790	7,03	82.284,67	3.430,080	24.113,46	0,000	3.430,080	24.113,46	29,3%
2.15	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	169.719,480	0,55	93.345,71	169.719,478	93.345,71	0,000	169.719,478	93.345,71	100,0%
	Subtotal serviços de Pavimentação				1.718.916,12		188.219,88			188.219,88	10,9%
3	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA										
3.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/ REVEST VEGETAL VPA 01	M	420,000	77,52	32.558,40	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
3.2	ESCAV MECAN, REATERRO E COMPAC DE MATERIAL DE 1ª CAT	M³	22,000	9,34	205,48	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
3.3	CORPO DE BUEIRO - BSTC DN 0,60 M	M	11,000	338,43	3.722,73	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
3.4	BOCA DE BUEIRO - BSTC DN 0,60 M	UNID	2,000	765,47	1.530,94	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
	Subtotal de Drenagem				39.017,55		0,00			0,00	0,0%

Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 17007291-4

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA					RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA		
Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso			Ordem de início de serviço: 21/09/2011			Nº Contrato: 064/2011		Prazo de Execução 120 dias			
Local: Aeroporto Municipal			Medição: 1ª Medição Provisória			Data Assinat: 20/09/2011		Prazo Restante 81 dias			
Bairro: Zona Rural			Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011			Convêno:		Valor do Contrato 2.888.724,64			
Município: Sorriso - MT			Período acumulado: 22/09/2011 a 20/11/2011			Empresa: Constil		Valor med acumul 417.000,14			
Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada			
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	% Exec
4	SINALIZAÇÃO										
4.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	5.619,350	20,13	113.117,51	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
	Subtotal de pavimentação				113.117,51		0,00			0,00	0,0%
5	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
5.1	HIDROSSEMEADURA	M²	80.000,000	1,40	112.000,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
5.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS P/ ESCOAM/ ÁGUA CX EMPRÉST.	M³	18.200,000	5,00	91.000,00	18.200,000	91.000,00	0,000	18.200,000	91.000,00	100,0%
5.3	ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS CXS DE ESPRÉSTIMO	M³	11.993,652	6,26	75.080,26	11.993,652	75.080,26	0,000	11.993,652	75.080,26	100,0%
	Subtotal de Recuperação do Meio Ambiente				278.080,26		166.080,26			166.080,26	59,7%
6	SINALIZAÇÃO LUMINOSA										
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO COMPACTAÇÃO MATERIAL 1ª CAT	M³	500,000	43,93	21.965,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.2	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=50MM	M	630,000	15,66	9.865,80	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.3	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=75MM	M	3.910,000	18,02	70.458,20	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.4	INSTALAÇÃO REDES E LINHAS DE DUTOS PVC D=100MM	M	412,000	23,81	9.809,72	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.5	RECOMPOSIÇÃO DO TERRENO	M³	350,000	25,66	8.981,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.6	CAIXAS DE CONCRETO	UNID	16,000	331,68	5.306,88	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.7	MACIÇOS DE CONCRETO	UNID	87,000	160,34	13.949,58	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.8	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 1	UNID	1,000	674,66	674,66	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.9	CAIXA DE PASSAGEM TIPO 2	UNID	7,000	643,62	4.505,34	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.10	CAIXAS DE INSPEÇÃO	UNID	91,000	565,62	51.471,42	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.11	POÇOS DE ATERRAMENTO	UNID	17,000	550,66	9.361,22	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.12	LANÇAMENTO DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO E LIGAÇÕES	M	5.440,000	2,20	11.968,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.13	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO (16,0 M²)	M²	16,000	1.424,55	22.792,80	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
	BALIZAMENTO	M	4.500,000	12,19	54.855,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.14	LANÇAMENTO DOS CABOS DOS CIRCUITOS	UNID	103,000	1.091,67	112.442,01	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.15	INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUZ	M	350,000	40,68	14.238,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.16	LANÇAMENTO DOS CABOS DE CONTROLE										

Prefeitura Municipal de Sorriso

Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso	Ordem de início de serviço: 21/09/2011	Nº Contrato: 064/2011	Prazo de Execução: 120 dias
Local: Aeroporto Municipal	Medição: 1ª Medição Provisória	Data Assinat: 20/09/2011	Prazo Restante: 81 dias
Bairro: Zona Rural	Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011	Convênio:	Valor do Contrato: 2.888.724,64
Município: Sorriso - MT	Período acumulado: 22/09/2011 a 20/11/2011	Empresa: Constil	Valor med acumul: 417.000,14

Código	Discriminação	Unid	Contrato			Medição Atual		Medição Acumulada			
			Quantid	Preço Unit	Valor	Quantid	Valor	Medido Anterior	Medido Acumul	Valor Acumulado	% Exec
6.17	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA										
	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO 10 KW, 01 RCC 10 KW, CONTROLES DO FAROL E DA BIRUTA E ACESSÓRIOS	CJ	1,000	62.618,39	62.618,39	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.18	GRUPO-GERADOR TRIFÁSICO, 220 V, 27 KVA	CJ	1,000	45.865,48	45.865,48	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.19	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (30 KVA)	CJ	1,000	11.396,52	11.396,52	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.20	INSTALAÇÃO DE POSTE E MONTAGEM DO FAROL DE AERÓDROMO	CJ	1,000	65.809,43	65.809,43	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
6.21	MONTAGEM DA BIRUTA ILUMINADA	CJ	1,000	9.231,17	9.231,17	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
	Subtotal de drenagem de águas pluviais				617.565,62		0,00			0,00	0,0%
	TREVO DE ACESSO										
7.1	OBRAS COMPLEMENTARES										
7.1.1	ENLEIVAMENTO	M²	1.368,140	6,40	8.756,09	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE										
7.2.1	ESCAV MECAN, REATERRO E COMPAC DE MATERIAL DE 1ª CAT	M³	120,170	9,34	1.122,38	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2.2	MEIO FIO - MFC - 03	M	950,460	22,87	21.737,02	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2.3	DESCIDA D'ÁGUA DAR-02	M	17,000	68,07	1.157,19	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2.4	ENTRADA D'ÁGUA EDA-01	M	6,000	34,33	205,98	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.2.5	DISSIPADOR DE ENERGIA DED-01	UNID.	6,000	243,71	1.462,26	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.3	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA										
7.3.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	414,750	21,13	8.763,66	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.3.2	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHAS REFLET. BIDIRECIONAIS	UNID.	380,000	17,37	6.600,60	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.3.3	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHÕES REFLET. BIDIRECIONAIS	UNID.	83,000	43,76	3.632,08	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
7.3.4	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE PLACAS TOTALM.REFLETIVAS	M²	12,130	314,05	3.809,42	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,0%
	Subtotal Trevo de Acesso				57.246,68		0,00			0,00	0,0%
Total					2.888.724,64		417.000,14			417.000,14	14,4%

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em
Local/Data: Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2011

R\$417.000,14

Prefeitura Municipal de Sorriso
Ludiano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 17.12976-4



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

**1.1 Desmatamento, destoc. e
Limpeza de Arv de até 0,15m
(m2)**

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 1ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011


Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)					OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
Lateral (LD/LE) da Pista de Pouso		2.000,000	95,000	190.000,000					
Total - Medição Atual				190.000,000					
Total - Medição Acum Anterior				0,000					
Total - Medição Acumulada				190.000,000					

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO


Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Ordem de início de serviço: 21/09/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 1ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011

Município: Sorriso - MT


Empresa: Constil

2.1 Imprimação
(m²)

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)					OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
28,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000					
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	20,000	6.400,000					
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	10,000	5.600,000					
Total - Medição Atual				19.056,000					
Total - Medição Acum Anterior				0,000					
Total - Medição Acumulada				19.056,000					

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO


Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 1ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011

Município: Sorriso - MT


Empresa: Constil

2.6 Aquisição de CM-30
2.10 Transporte de CM-30
(ton)

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Tx (l/m²)	Peso (ton)			OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000	1,200	8,467			
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	20,000	6.400,000	1,200	7,680			
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	10,000	5.600,000	1,200	6,720			
Total - Medição Atual						22,867			
Total - Medição Acum Anterior						0,000			
Total - Medição Acumulada						22,867			

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO


Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO
de solo com adição de
material
(m³)

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 1ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011


Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)			OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
29,00 + 4,80	41,00 + 0,00	235,200	30,000	7.056,000	0,18	1.270,080			
41,00 + 0,00	57,00 + 0,00	320,000	20,000	6.400,000	0,18	1.152,000			
57,00 + 0,00	85,00 + 0,00	560,000	10,000	5.600,000	0,18	1.008,000			
Total - Medição Atual						3.430,080			
Total - Medição Acum Anterior						0,000			
Total - Medição Acumulada						3.430,080			

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO


Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

2.15 Transporte Local em
Rodovia pavimentada
(T.km)

Obra: Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica

Nº Contrato: 064/2011

Local: Vias Urbanas

Medição: 1ª Medição Provisória

Bairro: Amazonas

Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011

Munic.: Sorriso

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	Dens. Material (t/m³)	DMT (km)	Transporte (T.km)	OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.									
29,00 + 4,80	85,00 + 0,00	1.115,200	45,000	50.184,000	0,087	4.366,008	2,000	15,000	130.980,240	Pista de pouso
		132,500	8,000	1.060,000	0,087	92,220	2,000	15,000	2.766,600	Taxiway
		129,000	94,000	12.126,000	0,087	1.054,962	2,000	15,000	31.648,860	Pátio de estacionamento de aeronave
				1.244,350	0,087	108,258	2,000	15,000	3.247,754	Stop-way - cabeceira 22
				386,300	0,087	33,608	2,000	15,000	1.008,243	Raio de curva do taxiway - pista de pouso (2 unid)
				25,970	0,087	2,259	2,000	15,000	67,782	Raio de curva do taxiway - pátio de estacionamento
Total - Medição Atual									169.719,478	
Total - Medição Acum Anterior									0,000	
Total - Medição Acumulada									169.719,478	

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

**5.2 Escav. de vala para
escoam/água cx emprést.
(m³)**

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Medição: 1ª Medição Provisória

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)			OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
-3,00 + 0,00	88,00 + 0,00	1.820,000	20,000	36.400,000	0,50	18.200,000			
Total - Medição Atual						18.200,000			
Total - Medição Acum Anterior						0,000			
Total - Medição Acumulada						18.200,000			

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO


Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4



GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

**5.3 Escav. e regularização
das cx de empréstimo
(m³)**

Obra: Pavimentação Asfáltica, drenagem e trevo de acesso

Nº Contrato: 064/2011

Local: Aeroporto Municipal

Data Assinat: 20/09/2011

Bairro: Zona Rural

Período de medição: 22/09/2011 a 20/11/2011

Município: Sorriso - MT

Empresa: Constil

Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)			OBSERVAÇÃO
Inicial + Frac.	Final + Frac.								
0 + 0,00	8 + 0,00	160,00		6,600	0,524	553,34			
8 + 0,00	11 + 0,00	60,00		6,600	0,000	0,00			
11 + 0,00	65 + 0,00	1.080,00		6,600	1,059	7.548,55			
65 + 0,00	72 + 0,00	140,00		6,600	1,059	978,52			
72 + 0,00	73 + 0,00	20,00		6,600	0,020	2,64			
73 + 0,00	74 + 0,00	20,00		6,600	0,000	0,00			
74 + 0,00	109 + 0,00	700,00		6,600	0,630	2.910,60			
Total - Medição Atual						11.993,652			
Total - Medição Acum Anterior						0,000			
Total - Medição Acumulada						11.993,652			

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sorriso
Luciano C. Scaburi
Engenheiro Civil
CREA 170072976-4
